
Curva de Inversiones
GERONIMO RIZZO S.A. - OLIVO ZAMBANO S.A. - MARCALBA S.A. – UT
MEJORAMIENTO DELTRAMO MEDIO DELRÍO LUJÁN ETAPA II B

L.P.I. N°12/21

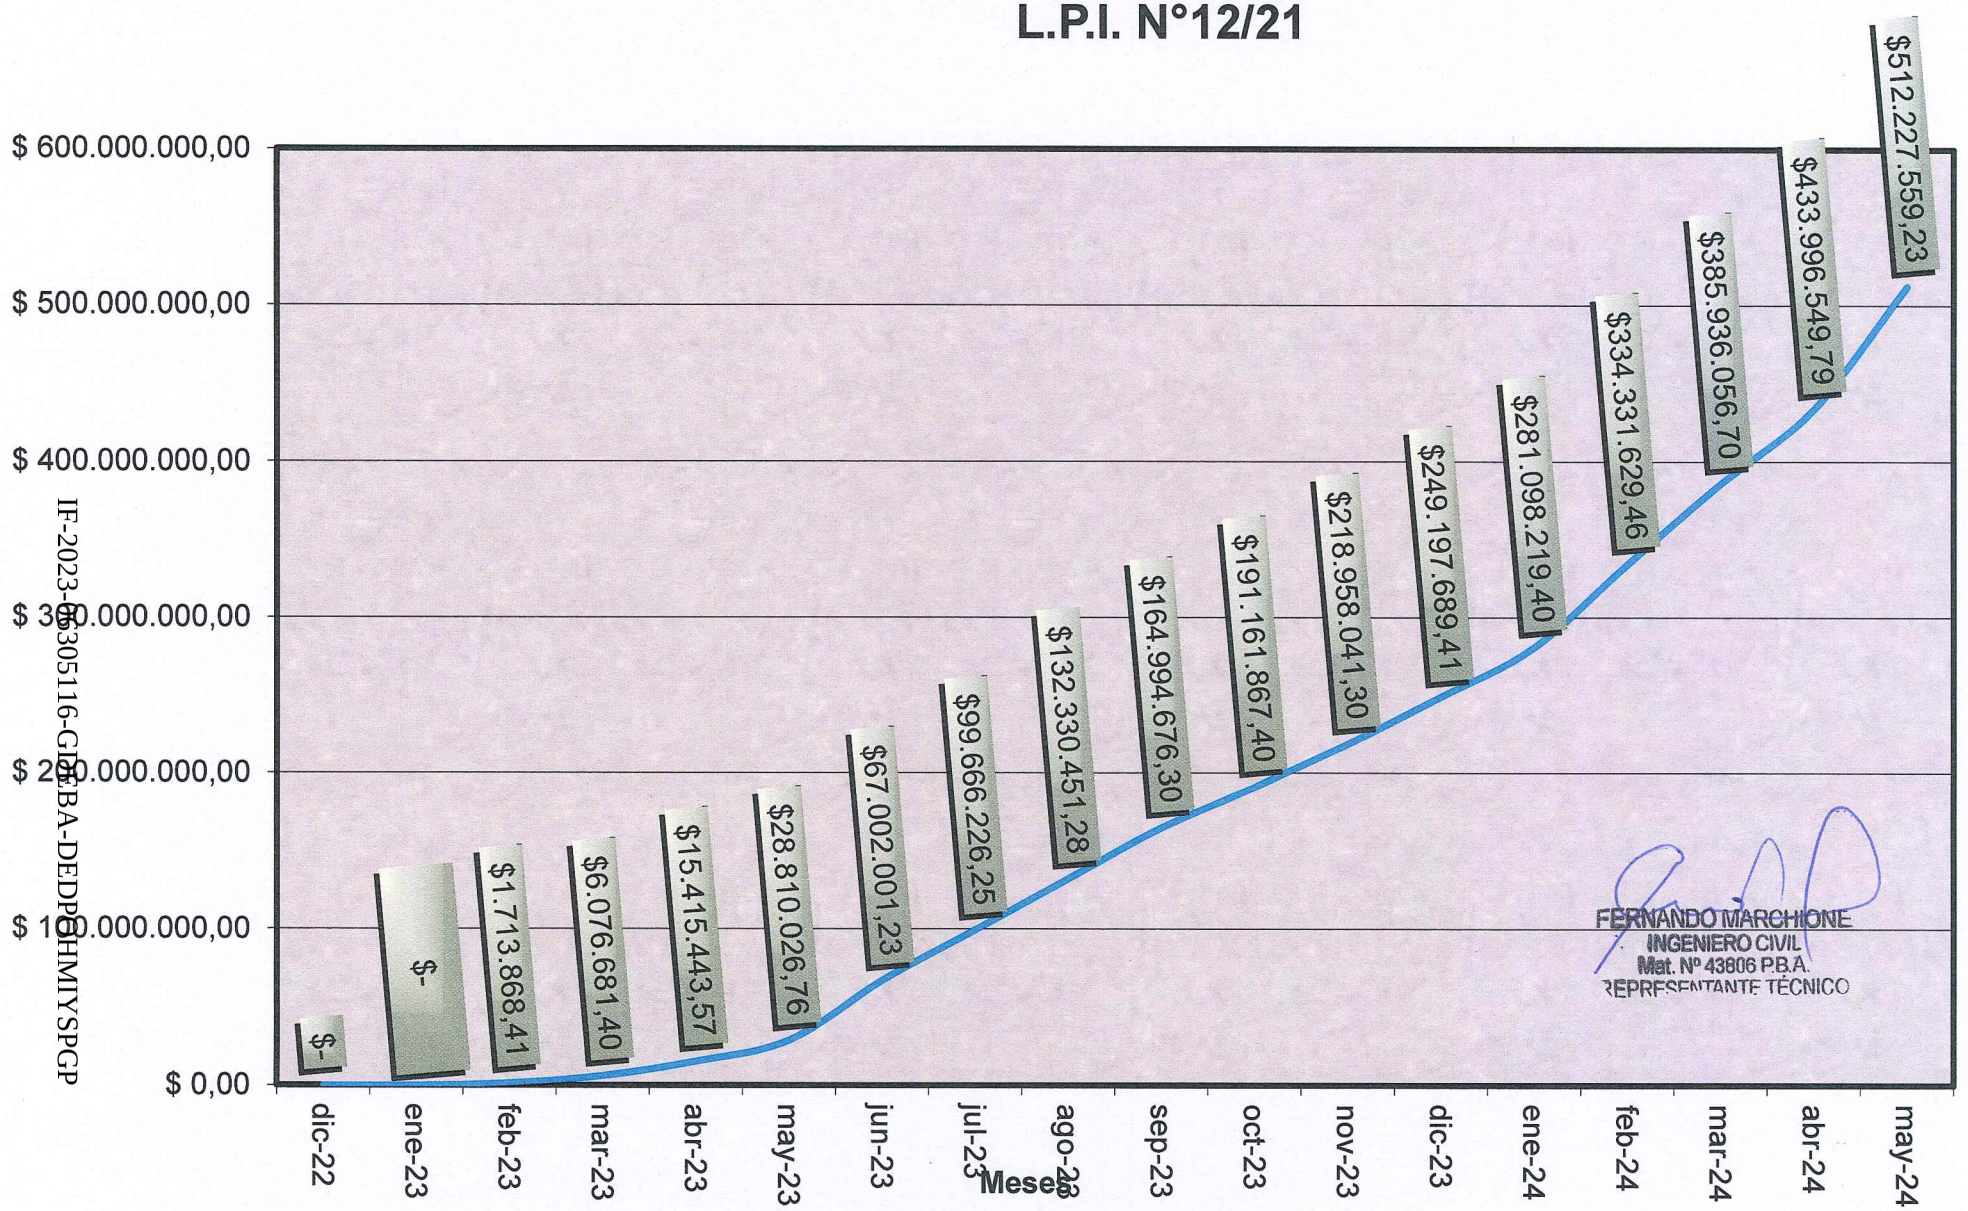

FERNANDO MARCHIONE
INGENIERO CIVIL
Mat. Nº 43806 P.B.A.
REPRESENTANTE TÉCNICO

Curva de Inversiones

GERONIMO RIZZO S.A. - OLIVO ZAMBANO S.A. - MARCALBA S.A. – UT

MEJORAMIENTO DELTRAMO MEDIO DELRÍO LUJÁN ETAPA II B

L.P.I. N°12/21

ENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE HIDRÁULICA
EMPRESA: GERONIMO RIZZO S.A. - OLIVO ZAMBANO S.A. - MARCALBA S.A. – UT
MEJORAMIENTO DEL TRAMO MEDIO DEL RÍO LUJÁN ETAPA II B
PARTIDO : LUJÁN
EXP. YIO LICITACION: L.P.I. N°12/21

MARCALBA — Olivo Zambano sa Construcciones — GERONIMO RIZZO S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

PLAN DE TRABAJOS

ITEM	DESCRIPCION OBRAS A EJECUTAR	U.M.	CANTIDAD	MONTO	PORCEN	PLAZO DE OBRA (en Meses)																
						dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24
1.1	Ingeniería Complementaria y de Detalle	Global	1,00	$ 13.372.936,21	2,611%			0,2611%	0,2611%	0,2611%													0,2611%
2.1	Plan de Gestión Ambiental y Social	Global	1,00	$ 3.525.449,59	0,688%			0,0688%	0,0688%	0,0688%	0,0688%	0,0688%	0,0688%	0,0688%	0,0688%	0,0688%	0,0688%	0,0688%	0,0688%	0,0688%	0,0688%	0,0688%	
3.1	Traslado de Equipos e Instalación de Obrador	Global	1,00	$ 7.452.859,66	1,455%					0,0727%	0,4365%	0,9437%											
4.1	Limpieza de márgenes	Ha	19,26	$ 32.029.682,19	6,253%						1,2598%	1,2598%	1,2598%	1,2598%	1,2598%	1,2598%							
4.2	Movimiento de suelo para adecuacion del cauce	m3	557.098,64	$ 247.535.638,71	48,329%							4,8271%	4,8271%	4,8271%	4,8271%	4,8271%	4,8271%	4,8271%	4,8271%	4,8271%	4,8271%	4,8271%
4.3	Transporte de Suelo Sobrante - 60 Hm	Hm.m3	45.124.989,84	$ 53.247.488,01	10,395%							0,8663%	0,8663%	0,8663%	0,8663%	0,8663%	0,8663%	0,8663%	0,8663%	0,8663%	0,8663%	0,8663%
5.1	Alambrados	m	10.600,00	$ 13.100.752,00	2,558%														0,3197%	0,6394%	0,6394%	0,6394%	0,3197%
6.1	Confección de Mensuras	unidad	36,00	$ 4.039.091,64	0,789%				0,1183%	0,2760%	0,2760%	0,1183%											
7.1	Hormigón tipo H-30 para Alcantarilla	m3	130,00	$ 14.826.977,10	2,895%												0,2895%	0,7237%	0,7237%	0,7237%	0,4342%		
8.1	Acero en barras y malla para hormigon	kg	4.218,00	$ 1.234.444,80	0,241%												0,0241%	0,0602%	0,0602%	0,0602%	0,0361%		
9.1	Bicisenda de 1,50 m. de ancho	m	5.327,00	$ 44.539.150,91	8,693%															0,8693%	0,8693%	0,8693%	0,8693%
9.2	Modulo sector de esparcimiento Tipo E y equipamiento Tipo E	unidad	4,00	$ 10.410.131,08	2,032%															2,1734%	2,1734%	2,1734%	2,1734%
9.3	Modulo sector de esparcimiento Tipo F y equipamiento Tipo F	unidad	5,00	$ 11.884.316,65	2,319%																		2,0322%
9.4	Arbolado	unidad	888,00	$ 5.758.058,40	1,124%																		0,2291%
9.5	Bolardos sendа ecuestre	unidad	1.522,00	$ 29.654.526,24	5,789%															1,4473%	1,4473%	1,4473%	1,4473%
9.6	Totems Informativos	unidad	6,00	$ 1.026.532,52	0,200%																		0,2004%
10.1	Suma Provisional	global	1,00	$ 9.000.000,00	1,757%					0,0878%	0,0878%	0,0878%	0,0878%	0,0878%	0,0878%	0,0878%	0,0878%	0,0878%	0,0878%	0,0878%	0,0878%	0,0878%	0,0878%
11.2	Apoyos Provisionales por Proyecto	global	1,00	$ 2.416.256,74	0,472%						0,4717%												
11.1	Honorarios Profesionales por Representación Técnica	global	1,00	$ 7.182.145,78	1,402%			0,0047%	0,0119%	0,0238%	0,0357%	0,1045%	0,0894%	0,0894%	0,0894%	0,0716%	0,0716%	0,0239%	0,0239%	0,0239%	0,0478%	0,0478%	0,0478%
	TOTAL			$ 512.227.559,23	100,000%																		
	CERTIFICACION PARCIAL							0,33%	0,85%	1,82%	2,61%	7,46%	6,38%	6,38%	6,38%	5,11%	5,43%	5,90%	6,23%	10,39%	10,07%	9,38%	15,27%
	CERTIFICACION ACUMULADA							0,33%	1,19%	3,01%	5,62%	13,08%	19,46%	25,83%	32,21%	37,32%	42,75%	48,65%	54,88%	65,27%	75,34%	84,73%	100,00%
	CERTIFICACION PARCIAL					$ -	$ -	$ 1.713.868,41	$ 4.362.812,99	$ 9.338.762,17	$ 13.394.583,19	$ 38.191.974,47	$ 32.664.225,03	$ 32.664.225,03	$ 32.664.225,03	$ 26.167.191,10	$ 27.796.173,90	$ 30.239.648,11	$ 31.900.529,99	$ 53.233.410,05	$ 51.604.427,25	$ 48.060.493,08	$ 78.231.009,44
	CERTIFICACION ACUMULADA					$ -	$ -	$ 1.713.868,41	$ 6.076.681,40	$ 15.415.443,57	$ 28.810.026,76	$ 67.002.001,23	$ 99.666.226,25	$ 132.330.451,28	$ 164.994.676,30	$ 191.161.867,40	$ 218.958.041,30	$ 249.197.689,41	$ 281.098.219,40	$ 334.331.629,46	$ 385.936.056,70	$ 433.996.549,79	$ 512.227.559,23

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA

	Anticipo de obra	CL	1,00	$ 51.222.755,92	10,000%	10,000%																	
	Devolucion del anticipo de obra	CI	1,00	-$ 51.222.755,92	-10,000%			-2,000%	-2,000%	-2,000%	-2,000%	-2,000%	-2,000%	-2,000%	-2,000%	-2,000%	-2,000%	-2,000%	-2,000%	-2,000%	-2,000%	-2,000%	-2,000%
	TOTAL																						
	CERTIFICADO ANTICIPO DE OBRA					$ 51.222.755,92																	
	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA PARCIAL					$ -	$ -	-$ 171.386,84	-$ 436.281,30	-$ 933.876,22	-$ 1.339.458,32	-$ 3.819.197,45	-$ 3.266.422,50	-$ 3.266.422,50	-$ 3.266.422,50	-$ 2.616.719,11	-$ 2.779.617,39	-$ 3.023.964,81	-$ 3.190.053,00	-$ 5.323.341,01	-$ 5.160.442,72	-$ 4.806.049,31	-$ 7.823.100,94
	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA ACUMULADO					$ -	$ -	-$ 171.386,84	-$ 607.668,14	-$ 1.541.544,36	-$ 2.881.002,68	-$ 6.700.200,12	-$ 9.966.622,63	-$ 13.233.045,13	-$ 16.499.467,63	-$ 19.116.186,74	-$ 21.895.804,13	-$ 24.919.768,94	-$ 28.109.821,94	-$ 33.433.162,95	-$ 38.593.605,67	-$ 43.399.654,98	-$ 51.222.755,92
	CERTIFICACIÓN PARCIAL CON DESCUENTO DE ANTICIPO DE OBRA					$ 51.222.755,92	$ -	$ 1.542.481,57	$ 3.926.531,69	$ 8.404.885,96	$ 12.055.124,87	$ 34.372.777,02	$ 29.397.802,52	$ 29.397.802,52	$ 29.397.802,52	$ 23.550.471,99	$ 25.016.556,51	$ 27.215.683,30	$ 28.710.476,99	$ 47.910.069,05	$ 46.443.984,52	$ 43.254.443,78	$ 70.407.908,50
	CERTIFICACIÓN ACUMULADA CON DESCUENTO DE ANTICIPO DE OBRA					$ 51.222.755,92	$ 51.222.755,92	$ 52.765.237,49	$ 56.691.769,18	$ 65.096.655,14	$ 77.151.780,00	$ 111.524.557,03	$ 140.922.359,55	$ 170.320.162,07	$ 199.717.964,60	$ 223.268.436,58	$ 248.284.993,10	$ 275.500.676,39	$ 304.211.153,39	$ 352.121.222,43	$ 398.565.206,96	$ 441.819.650,73	$ 512.227.559,23

FERNANDO MARCHIONE
INGENIERO CIVIL
Mat. Nº 43806 P.B.A.
REPRESENTANTE TÉCNICO

G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2023 - Año de la democracia Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2023-06305116-GDEBA-DEDPOHMIYSPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 23 de Febrero de 2023

Referencia: Plan de trabajo y curva de inversiones, “MEJORAMIENTO DEL TRAMO MEDIO DEL RIO LUJAN ETAPA II B”, EX-2023-05335183-GDEBA-DPTLMIYSPGP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS, ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511
Date: 2023.02.23 13:19:34 -03'00'

Luis Miguel Teran
Personal Técnico
Dirección Ejecutiva
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS, ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511
Date: 2023.02.23 13:19:35 -03'00'
