LEYMER

OBRA: "Red Secundaria de Agua - Ituzaingó 3A Etapa 1 y 2 - Lote 1

Partido de Ituzaingó. LPN N°2/23 BID

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	$ UNIT.	$ TOTAL	Incidencia	Fechas	31/7/2024	31/8/2024	30/9/2024	31/10/2024	30/11/2024	31/12/2024	31/1/2025	28/2/2025	31/3/2025	30/4/2025	31/5/2025	30/6/2025	31/7/2025	31/8/2025	30/9/2025	31/10/2025	30/11/2025	31/12/2025	31/1/2026
							Dias Mes					5	31	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31
							Dias Acum.					5	36	67	95	126	156	187	217	248	279	309	340	370	401	432
							Mes	jul-24	ago-24	sept-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26
							Mes Nº					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	CONTRATO							30/7/2024																		
	ORDEN DE INICIO											25/11/2024														
	PRESENTACION DE DOCUMENTACION PARA PERMISO MUNICIPAL									19/9/2024																
	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROYECTO/EJECUTIVO	GL	1,00	$ 43.501.200,67	$ 43.501.200,67	3,21%	% del Item					60,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%						
							% Acumulado					60,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	100,00%						
							$ del Mes					$ 17.400.480,27	$ 15.225.420,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.875.300,17						
							$ Acumulado					$ 17.400.480,27	$ 32.625.900,50	$ 32.625.900,50	$ 32.625.900,50	$ 32.625.900,50	$ 32.625.900,50	$ 32.625.900,50	$ 32.625.900,50	$ 43.501.200,67						
							Cant del Mes					0,60	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25						
							Cant Acumulado					0,60	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,00						
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	GL	1,00	$ 9.569.521,94	$ 9.569.521,94	0,71%	% del Item					2,00%	1,00%	4,00%	6,00%	9,00%	9,00%	8,00%	12,00%	11,00%	6,00%	11,00%	11,00%	11,00%		
							% Acumulado					2,00%	3,00%	7,00%	13,00%	22,00%	31,00%	39,00%	51,00%	62,00%	68,00%	79,00%	90,00%	101,00%		
							$ del Mes					$ 191.390,44	$ 95.695,22	$ 382.780,88	$ 861.256,97	$ 861.256,97	$ 861.256,97	$ 765.561,75	$ 1.052.647,41	$ 1.052.647,41	$ 765.561,75	$ 1.052.647,41	$ 1.052.647,41	$ 1.052.647,41		
							$ Acumulado					$ 191.390,44	$ 287.085,66	$ 669.866,54	$ 1.531.123,51	$ 2.392.380,48	$ 3.253.637,45	$ 4.019.199,20	$ 5.071.846,61	$ 6.124.494,02	$ 6.890.055,77	$ 7.942.703,18	$ 8.995.350,59	$ 10.047.997,99		
							Cant del Mes					0,02	0,01	0,04	0,08	0,09	0,09	0,08	0,11	0,11	0,08	0,11	0,11	0,11		
							Cant Acumulado					0,02	0,03	0,07	0,15	0,24	0,33	0,41	0,52	0,63	0,71	0,82	0,93	1,04		
	EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS																									
	Excavación y relleno para cañerías	m3	14.324,27	$ 10.648,79	$ 152.536.121,84	11,27%	% del Item							5,33%	6,49%	10,73%	12,37%	8,86%	12,03%	12,45%	5,76%	6,98%	8,98%	6,98%	6,49%	
							% Acumulado							5,33%	10,61%	21,32%	33,69%	42,55%	54,58%	66,65%	72,51%	79,49%	88,51%	95,51%	100,00%	
							$ del Mes							$ 5.051.471,50	$ 6.855.909,98	$ 10.463.897,97	$ 18.719.933,89	$ 13.510.419,36	$ 18.355.309,66	$ 18.992.216,97	$ 8.773.305,39	$ 10.648.790,00	$ 10.648.790,00	$ 10.648.790,00	$ 9.898.413,35	
							$ Acumulado							$ 5.051.471,50	$ 11.907.375,48	$ 22.369.273,45	$ 51.089.167,34	$ 64.599.586,68	$ 82.954.916,14	$ 101.947.033,11	$ 110.680.338,49	$ 121.329.128,49	$ 131.987.918,49	$ 142.636.708,49	$ 152.535.121,84	
							Cant del Mes							850,00	643,81	1543,69	1757,31	1268,73	1722,78	1783,50	822,00	1000,00	1000,00	1000,00	929,63	
							Cant Acumulado							850,00	1493,81	3037,51	4797,83	6066,56	7789,34	9572,84	10394,84	11394,84	12394,84	13394,84	14324,47	
	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS																									
	Cañeria PVC agua DN 90 mm - Clase 10	m	19.428,00	$ 8.353,40	$ 162.289.855,20	11,99%	% del Item					2,47%	0,00%	4,04%	0,63%	10,73%	12,30%	8,76%	12,31%	15,38%	2,97%	6,85%	7,72%	10,29%	5,97%	
							% Acumulado					2,47%	2,47%	7,33%	7,95%	18,67%	30,98%	39,74%	52,05%	67,58%	70,56%	77,41%	85,14%	95,43%	100,00%	
							$ del Mes					$ 4.009.632,00	$ 0,00	$ 7.859.714,06	$ 1.027.468,25	$ 17.410.080,42	$ 19.964.709,53	$ 14.216.833,68	$ 19.978.842,04	$ 24.969.937,71	$ 4.822.417,82	$ 11.118.740,00	$ 12.530.100,00	$ 16.706.800,00	$ 9.684.931,96	
							$ Acumulado					$ 4.009.632,00	$ 4.009.632,00	$ 11.869.346,06	$ 12.896.814,26	$ 30.307.306,68	$ 50.272.016,21	$ 64.488.849,87	$ 84.466.807,71	$ 109.356.853,42	$ 114.179.283,24	$ 125.298.123,24	$ 137.828.223,24	$ 154.535.023,24	$ 162.289.855,20	
							Cant del Mes					480,00	0,00	940,90	123,00	2084,14	2390,65	1701,90	2391,63	2979,62	577,39	1330,00	1500,00	2000,00	1159,40	
							Cant Acumulado					480,00	480,00	1420,90	1543,90	3628,14	6018,15	7720,05	10111,68	13091,30	13668,69	14758,69	16258,69	18258,69	19418,09	
	Cañeria PVC agua DN 110 mm - Clase 10	m	7.045,00	$ 10.149,03	$ 71.499.916,35	5,28%	% del Item					2,56%	0,00%	1,47%	10,63%	14,37%	6,38%	11,08%	6,24%	5,96%	16,59%	14,19%	7,10%	7,73%		
							% Acumulado					2,56%	2,56%	4,02%	14,65%	29,02%	35,38%	46,27%	52,51%	58,47%	75,06%	89,25%	96,35%	104,08%		
							$ del Mes					$ 1.826.825,60	$ 0,00	$ 1.048.394,80	$ 7.599.593,66	$ 10.274.088,08	$ 2.977.725,40	$ 7.923.149,74	$ 4.463.543,80	$ 4.217.530,31	$ 10.405.293,01	$ 10.180.030,00	$ 5.074.515,00	$ 5.530.253,09		
							$ Acumulado					$ 1.826.825,60	$ 1.826.825,60	$ 2.875.220,20	$ 10.474.813,86	$ 20.748.879,91	$ 23.726.605,31	$ 31.649.755,06	$ 36.113.293,45	$ 40.330.823,76	$ 50.736.117,16	$ 60.916.147,16	$ 65.990.662,16	$ 71.520.915,25		
							Cant del Mes					180,00	0,00	103,30	748,80	1012,12	293,40	780,68	439,80	415,56	1025,85	1000,00	500,00	545,00		
							Cant Acumulado					180,00	180,00	283,30	1032,10	2044,22	2337,62	3118,30	3558,10	3973,85	4999,11	5999,11	6499,11	7044,00		
	Cañeria PVC agua DN 160 mm - Clase 10	m	750,00	$ 17.633,40	$ 13.225.050,00	0,98%	% del Item													33,60%	0,00%	8,87%	39,73%	18,00%		
							% Acumulado													33,60%	33,60%	42,27%	82,00%	100,00%		
							$ del Mes													$ 4.443.615,80	$ 0,00	$ 1.146.171,00	$ 5.254.793,20	$ 2.380.509,00		
							$ Acumulado													$ 4.443.615,80	$ 4.443.616,80	$ 5.589.787,80	$ 10.844.581,00	$ 13.225.050,00		
							Cant del Mes													252,00	0,00	85,00	398,00	135,00		
							Cant Acumulado													252,00	252,00	337,00	735,00	870,00		
	Cañeria PVC agua DN 225 mm - Clase 10	m	1.650,00	$ 32.192,60	$ 53.117.790,00	3,92%	% del Item						3,66%	13,39%	13,42%	0,00%	5,09%	8,81%	24,80%	0,00%	15,08%						
							% Acumulado						3,66%	13,03%	26,45%	26,45%	31,54%	40,35%	65,14%	65,14%	80,22%					
							$ del Mes						$ 1.931.556,00	$ 10.301.632,00	$ 12.458.220,64	$ 0,00	$ 4.828.890,00	$ 2.594.804,74	$ 12.745.894,10	$ 0,00	$ 8.315.992,43					
							$ Acumulado						$ 1.931.556,00	$ 12.233.188,00	$ 24.672.408,64	$ 24.672.408,64	$ 29.501.298,64	$ 32.096.103,38	$ 44.841.797,57	$ 44.841.797,57	$ 53.117.790,00					
							Cant del Mes						60,00	320,00	386,40	0,00	150,00	79,36	396,80	0,00	258,41					
							Cant Acumulado						60,00	380,00	766,40	766,40	916,40	995,76	1392,56	1392,56	1650,00					
	Conexiones domiciliarias de Agua																									
	Conexiones domiciliarias cortas	Unidad	1.868,00	$ 68.587,33	$ 128.868.332,44	9,52%	% del Item							2,73%	2,16%	8,74%	8,46%	10,60%	9,65%	10,38%	7,13%	7,68%	9,19%	9,19%	13,26%	
							% Acumulado							2,73%	4,89%	13,63%	24,09%	34,69%	44,34%	54,72%	61,85%	69,53%	78,64%	87,83%	101,09%	
							$ del Mes							$ 3.518.363,83	$ 4.070.352,67	$ 12.855.694,06	$ 10.895.998,18	$ 13.689.691,39	$ 12.693.668,72	$ 13.383.549,08	$ 9.179.314,89	$ 9.858.326,20	$ 11.737.846,10	$ 11.737.846,10	$ 17.799.698,57	
							$ Acumulado							$ 3.518.363,83	$ 7.588.606,50	$ 20.184.300,56	$ 31.080.298,74	$ 44.769.990,13	$ 57.397.458,86	$ 70.781.009,58	$ 79.956.324,47	$ 89.814.541,67	$ 101.342.387,77	$ 113.070.233,87	$ 130.869.932,44	
							Cant del Mes							51,00	59,00	182,00	158,00	198,00	184,00	194,00	133,00	143,00	170,00	170,00	258,00	
							Cant Acumulado							51,00	110,00	292,00	450,00	648,00	832,00	1026,00	1159,00	1302,00	1472,00	1642,00	1900,00	
	Conexiones domiciliarias largas	Unidad	1.257,00	$ 136.184,72	$ 171.135.593,04	12,67%	% del Item							4,09%	5,79%	13,13%	12,81%	11,38%	10,07%	10,30%	5,57%	3,98%	7,98%	7,98%	6,52%	
							% Acumulado							4,09%	9,73%	22,85%	35,73%	47,10%	57,17%	68,02%	73,59%	77,57%	85,52%	93,48%	100,00%	
							$ del Mes							$ 6.955.629,72	$ 9.819.439,84	$ 22.301.498,80	$ 21.957.999,92	$ 19.303.014,96	$ 17.184.474,72	$ 18.464.706,68	$ 9.566.930,40	$ 6.819.936,00	$ 13.628.472,00	$ 13.628.472,00	$ 11.183.547,04	
							$ Acumulado							$ 6.955.629,72	$ 16.775.350,56	$ 39.076.849,36	$ 61.034.849,28	$ 80.337.864,24	$ 97.522.338,96	$ 116.008.955,64	$ 126.155.886,04	$ 132.975.822,04	$ 146.613.574,04	$ 160.252.046,08	$ 171.435.593,04	
							Cant del Mes							50,00	72,00	165,00	163,00	143,00	116,00	137,00	70,00	50,00	100,00	100,00	82,00	
							Cant Acumulado							50,00	122,00	288,00	451,00	594,00	710,00	847,00	917,00	967,00	1067,00	1167,00	1249,00	
	VALVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASOCIADAS																									
	Hidrante a resalto DN 75	Unidad	43,00	$ 1.616.147,95	$ 69.494.361,85	5,13%	% del Item							8,98%	0,00%	9,30%	6,98%	9,30%	6,98%	6,98%	2,33%	11,63%	16,28%	16,28%	6,98%	
							% Acumulado							8,98%	8,98%	18,28%	25,26%	34,58%	41,56%	48,53%	50,86%	62,47%	78,74%	95,02%	100,00%	
							$ del Mes							$ 4.848.443,85	$ 0,00	$ 8.464.591,80	$ 4.848.443,85	$ 8.464.591,80	$ 4.848.443,85	$ 4.848.443,85	$ 1.616.147,95	$ 8.080.739,75	$ 11.313.035,65	$ 11.313.035,65	$ 4.848.443,85	
							$ Acumulado							$ 4.848.443,85	$ 4.848.443,85	$ 13.313.035,65	$ 18.161.479,50	$ 22.626.071,30	$ 27.474.515,15	$ 32.322.959,00	$ 33.939.106,95	$ 42.019.846,70	$ 53.332.882,35	$ 64.645.918,00	$ 69.494.361,85	
							Cant del Mes							3,00	0,00	4,00	3,00	4,00	3,00	3,00	1,00	5,00	7,00	7,00	3,00	
							Cant Acumulado							3,00	3,00	7,00	10,00	14,00	17,00	20,00	21,00	26,00	33,00	40,00	43,00	
	Toma para motobomba DN 100	Unidad	12,00	$ 2.971.914,18	$ 35.662.970,16	2,64%	% del Item							16,67%	8,33%	8,33%	16,67%	8,33%	0,00%	0,00%	8,33%	8,33%	16,67%			
							% Acumulado							16,67%	25,00%	33,33%	50,00%	58,33%	58,33%	58,33%	66,67%	75,00%	91,67%	100,00%		
							$ del Mes							$ 5.943.828,36	$ 2.971.914,18	$ 2.971.914,18	$ 5.943.828,36	$ 2.971.914,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.971.914,18	$ 2.971.914,18	$ 5.943.828,36	$ 2.971.914,18		
							$ Acumulado							$ 5.943.828,36	$ 8.915.742,54	$ 11.887.656,72	$ 17.831.485,08	$ 20.803.399,26	$ 20.803.399,26	$ 20.803.399,26	$ 23.775.313,44	$ 26.747.227,62	$ 32.691.055,98	$ 35.662.970,16		
							Cant del Mes							2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00		
							Cant Acumulado							2,00	3,00	4,00	6,00	7,00	7,00	7,00	8,00	9,00	11,00	12,00		
	Toma para motobomba DN 150	Unidad	1,00	$ 3.912.257,45	$ 3.912.257,45	0,29%	% del Item												100,00%							
							% Acumulado												100,00%							
							$ del Mes												$ 3.912.257,45							
							$ Acumulado												$ 3.912.257,45							
							Cant del Mes												1,00							
							Cant Acumulado												1,00							

LEYMER S.A.
FEDERICO PODESTÁ CASTRO
APODERADO


IF-2025-36433840-DEBA-DEODPAYCMIVSPGP

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	$ UNIT.	$ TOTAL	Indifiendo	Fechas	31/7/2024	31/8/2024	30/9/2024	31/10/2024	30/11/2024	31/12/2024	31/1/2025	28/2/2025	31/3/2025	30/4/2025	31/5/2025	30/6/2025	31/7/2025	31/8/2025	30/9/2025	31/10/2025	30/11/2025	31/12/2025	31/1/2026
							Dias Mes					5	31	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31
							Dias Acum.					5	36	67	95	126	156	187	217	248	279	309	340	370	401	432
							Mes	jul-24	ago-24	sept-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26
							Mes Nº					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Válvula esclusa EURO 20 DN 80 mm	Unidad	117,00	$ 945.377,83	$ 110.609.206,11	8,17%	% del Item							2,82%	0,00%	12,82%	11,97%	7,09%	11,11%	11,11%	2,82%	5,13%	11,97%	11,97%	9,40%	
							% Acumulado							2,82%	2,82%	15,76%	28,73%	35,90%	47,01%	58,12%	61,04%	66,17%	78,63%	90,60%	100,00%	
							$ del Mes							$ 3.781.511,32	$ 0,00	$ 14.180.667,45	$ 13.235.289,62	$ 8.058.400,47	$ 12.289.511,79	$ 12.289.511,79	$ 3.781.511,32	$ 5.673.266,98	$ 13.235.289,62	$ 13.235.289,62	$ 10.399.156,13	
							$ Acumulado							$ 3.781.511,32	$ 3.781.511,32	$ 17.962.178,77	$ 31.197.468,39	$ 39.255.868,86	$ 51.545.380,65	$ 63.834.892,44	$ 67.616.403,76	$ 73.289.670,74	$ 86.524.960,36	$ 100.210.045,98	$ 110.609.202,11	
							Cant del Mes							6,00	0,00	15,00	14,00	9,00	13,00	13,00	4,00	6,00	14,00	14,00	11,00	
							Cant Acumulado							6,00	6,00	21,00	35,00	44,00	57,00	70,00	74,00	80,00	94,00	108,00	119,00	
	Válvula esclusa EURO 20 DN 100 mm	Unidad	27,00	$ 973.353,93	$ 26.280.556,11	1,94%	% del Item							16,52%	16,81%	0,00%		14,81%	7,41%	9,79%	11,11%	14,81%	7,41%	2,70%	2,70%	
							% Acumulado							16,52%	33,33%	33,33%		48,15%	55,56%	69,36%	80,47%	95,19%	92,59%	96,30%	100,00%	
							$ del Mes							$ 4.466.789,65	$ 3.893.415,72	$ 0,00		$ 5.893.415,72	$ 1.946.707,86	$ 973.353,93	$ 2.920.061,79	$ 3.893.413,72	$ 1.946.707,86	$ 973.353,93	$ 973.353,93	
							$ Acumulado							$ 4.466.789,65	$ 8.360.165,37	$ 8.360.165,37		$ 14.053.601,09	$ 16.000.308,95	$ 16.973.662,88	$ 19.893.724,67	$ 23.787.140,39	$ 25.733.848,25	$ 26.707.202,18	$ 27.680.556,11	
							Cant del Mes							5,00	4,00	0,00		6,00	2,00	1,00	3,00	4,00	2,00	1,00	1,00	
							Cant Acumulado							5,00	9,00	9,00		15,00	17,00	18,00	21,00	25,00	27,00	28,00	29,00	
	Válvula esclusa EURO 20 DN 150 mm	Unidad	5,00	$ 1.114.453,61	$ 5.572.268,05	0,41%	% del Item														20,00%	20,00%	0,00%	50,00%		
							% Acumulado														20,00%	40,00%	40,00%	100,00%		
							$ del Mes														$ 1.114.453,61	$ 1.114.453,61	$ 0,00	$ 3.343.360,83		
							$ Acumulado														$ 1.114.453,61	$ 2.228.907,22	$ 2.228.907,22	$ 5.572.268,05		
							Cant del Mes														1,00	1,00	0,00	3,00		
							Cant Acumulado														1,00	2,00	2,00	5,00		
	Válvula esclusa EURO 20 DN 200 mm	Unidad	7,00	$ 1.258.526,26	$ 8.809.683,82	0,65%	% del Item											14,29%	28,57%	28,57%	14,29%	0,00%	0,00%	0,00%	14,29%	
							% Acumulado											14,29%	42,86%	71,43%	85,71%	85,71%	85,71%	100,00%		
							$ del Mes											$ 1.258.526,26	$ 2.517.052,52	$ 2.517.052,52	$ 1.258.526,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.258.526,26	
							$ Acumulado											$ 1.258.526,26	$ 3.775.578,78	$ 6.292.631,30	$ 7.551.157,56	$ 7.551.157,56	$ 7.551.157,56	$ 7.551.157,56	$ 8.809.683,82	
							Cant del Mes											1,00	2,00	2,00	1,00	0,00			2,00	
							Cant Acumulado											1,00	3,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	
	LEVANTAMIENTO Y REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS																									
	Levantamiento y reparación de veredas	m2	5.877,00	$ 24.337,77	$ 143.033.074,29	10,57%	% del Item									0,00%	1,81%	1,03%	4,41%	17,84%	20,67%	13,61%	13,61%	11,81%	11,81%	3,19%
							% Acumulado									0,00%	1,81%	2,84%	7,25%	25,09%	45,76%	59,38%	72,99%	84,80%	96,61%	100,00%
							$ del Mes									$ 0,00	$ 3.583.210,91	$ 1.477.059,26	$ 6.303.725,81	$ 25.533.748,53	$ 29.570.380,55	$ 19.470.216,00	$ 19.470.216,00	$ 17.036.439,00	$ 17.036.438,00	$ 4.561.638,23
							$ Acumulado									$ 0,00	$ 3.583.210,91	$ 5.060.270,17	$ 11.363.995,98	$ 36.897.744,51	$ 66.468.125,06	$ 85.938.341,06	$ 105.408.557,06	$ 122.435.007,06	$ 139.471.446,06	$ 144.033.074,29
							Cant del Mes										106,19	50,69	229,01	1043,73	1215,00	800,00	800,00	700,00	700,00	187,48
							Cant Acumulado									0,00	106,19	156,88	425,89	1674,57	2889,57	3689,57	4489,57	5189,57	5877,00	
	Levantamiento y reparación de pavimentos	m2	3.331,00	$ 27.542,97	$ 91.745.633,07	6,78%	% del Item									0,00%	0,00%	0,18%	4,04%	2,24%	2,47%	3,00%	15,01%	15,01%	43,04%	
							% Acumulado									0,00%	0,00%	0,18%	4,22%	7,46%	9,93%	12,93%	27,94%	42,95%	85,99%	100,00%
							$ del Mes									$ 0,00	$ 0,00	$ 168.397,56	$ 3.707.008,33	$ 2.970.704,74	$ 2.264.307,56	$ 2.754.297,00	$ 13.771.485,00	$ 13.771.485,00	$ 39.506.402,68	
							$ Acumulado									$ 0,00	$ 0,00	$ 168.397,56	$ 3.875.405,89	$ 6.846.110,62	$ 9.110.418,19	$ 11.864.715,19	$ 25.636.200,19	$ 39.407.685,19	$ 78.914.087,87	
							Cant del Mes											6,11	134,99	107,05	82,21	100,00	500,00	500,00	1400,23	
							Cant Acumulado									0,00	0,00	6,11	140,70	248,55	330,77	430,77	930,77	1430,77	1830,77	1931,00
	EMPALMES																									
	Empalme a red primaria	Unidad	2,00	$ 1.007.914,86	$ 2.015.829,72	0,15%	% del Item											50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%				
							% Acumulado											50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%				
							$ del Mes											$ 1.007.914,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.007.914,86				
							$ Acumulado											$ 1.007.914,86	$ 1.007.914,86	$ 1.007.914,86	$ 1.007.914,86	$ 2.015.829,72				
							Cant del Mes											1,00				1,00				
							Cant Acumulado											1,00	1,00	1,00	1,00	2,00				
	Empalme a red secundaria	Unidad	9,00	$ 1.106.203,59	$ 9.955.832,31	0,74%	% del Item																22,22%	33,33%	22,22%	22,22%
							% Acumulado																22,22%	55,56%	77,78%	100,00%
							$ del Mes																$ 2.212.407,18	$ 3.318.610,77	$ 2.212.407,18	$ 2.212.407,18
							$ Acumulado																$ 2.212.407,18	$ 5.531.017,95	$ 7.743.425,13	$ 9.955.832,31
							Cant del Mes																2,00	3,00	2,00	2,00
							Cant Acumulado																2,00	5,00	7,00	9,00
	CELICES																									
	Cruce conductos pluvial existente	GL	1,00	$ 17.699.082,75	$ 17.699.082,75	1,31%	% del Item																	100,00%		
							% Acumulado																	100,00%		
							$ del Mes																	$ 17.699.082,75		
							$ Acumulado																	$ 17.699.082,75		
							Cant del Mes																	1,00		
							Cant Acumulado																	1,00		
	HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA	GL	1,00	$ 22.538.302,13	$ 22.538.302,13	1,67%	% del Item					1,76%	1,30%	3,59%	3,98%	8,08%	7,80%	7,58%	9,39%	10,95%	7,09%	7,04%	9,38%	11,15%	7,52%	3,41%
							% Acumulado					1,76%	3,06%	6,64%	10,63%	18,71%	26,51%	34,09%	43,48%	54,43%	61,51%	68,55%	77,93%	89,08%	96,59%	100,00%
							$ del Mes					$ 396.769,76	$ 292.182,11	$ 808.833,56	$ 897.873,38	$ 1.821.874,66	$ 1.758.736,96	$ 1.708.029,11	$ 2.116.266,57	$ 2.466.864,80	$ 1.597.187,85	$ 1.585.635,22	$ 2.114.362,64	$ 2.512.035,01	$ 1.694.185,79	$ 767.863,17
							$ Acumulado					$ 396.769,76	$ 688.951,86	$ 1.497.585,40	$ 2.395.458,77	$ 4.217.333,21	$ 5.975.870,17	$ 7.683.899,28	$ 9.800.165,85	$ 12.267.030,65	$ 13.864.220,50	$ 15.449.855,72	$ 17.564.218,36	$ 20.076.253,37	$ 21.770.439,16	$ 22.538.302,13
							Cant del Mes					0,02	0,01	0,04	0,04	0,09	0,08	0,08	0,09	0,11	0,07	0,07	0,09	0,11	0,08	0,03
							Cant Acumulado					0,02	0,03	0,07	0,11	0,19	0,27	0,34	0,43	0,54	0,61	0,68	0,78	0,89	0,97	1,00
	IMPORTE TOTAL				$ 1.353.372.439,30		Avance Mensual (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,76%	1,30%	3,59%	3,98%	8,08%	7,80%	7,58%	9,39%	10,95%	7,09%	7,04%	9,38%	11,15%	7,52%	3,41%
							Avance Mensual acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,76%	3,06%	6,64%	10,63%	18,71%	26,51%	34,09%	43,48%	54,43%	61,51%	68,55%	77,93%	89,08%	96,59%	100,00%
							Avance Mensual ($)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.825.097,86	$ 17.544.853,56	$ 48.556.556,49	$ 53.903.191,05	$ 109.399.307,86	$ 105.608.049,38	$ 102.563.161,72	$ 127.076.868,30	$ 148.129.581,58	$ 95.907.402,58	$ 95.213.693,93	$ 126.962.541,85	$ 150.841.839,42	$ 101.731.902,24	$ 46.108.391,47
							Avance Mensual acumulado ($)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.825.097,86	$ 41.369.951,42	$ 89.926.507,92	$ 143.829.698,97	$ 253.229.006,83	$ 358.837.056,21	$ 461.400.217,93	$ 588.477.086,23	$ 736.606.667,82	$ 832.514.070,39	$ 927.727.764,32	$ 1.054.690.306,17	$ 1.205.532.145,59	$ 1.307.264.047,83	$ 1.353.372.439,30

LEYMER S.A.
FEDERICO PODESTÁ CASTRO
APODERADO


IF-2025-36443384-GDEBA-DEDDPAYCMIYSPGP

OA70145 - Red Secundaria de Agua - Ituzaingó 3A Etapa 1 y 2 - Lote 1, Partido de Ituzaingó.

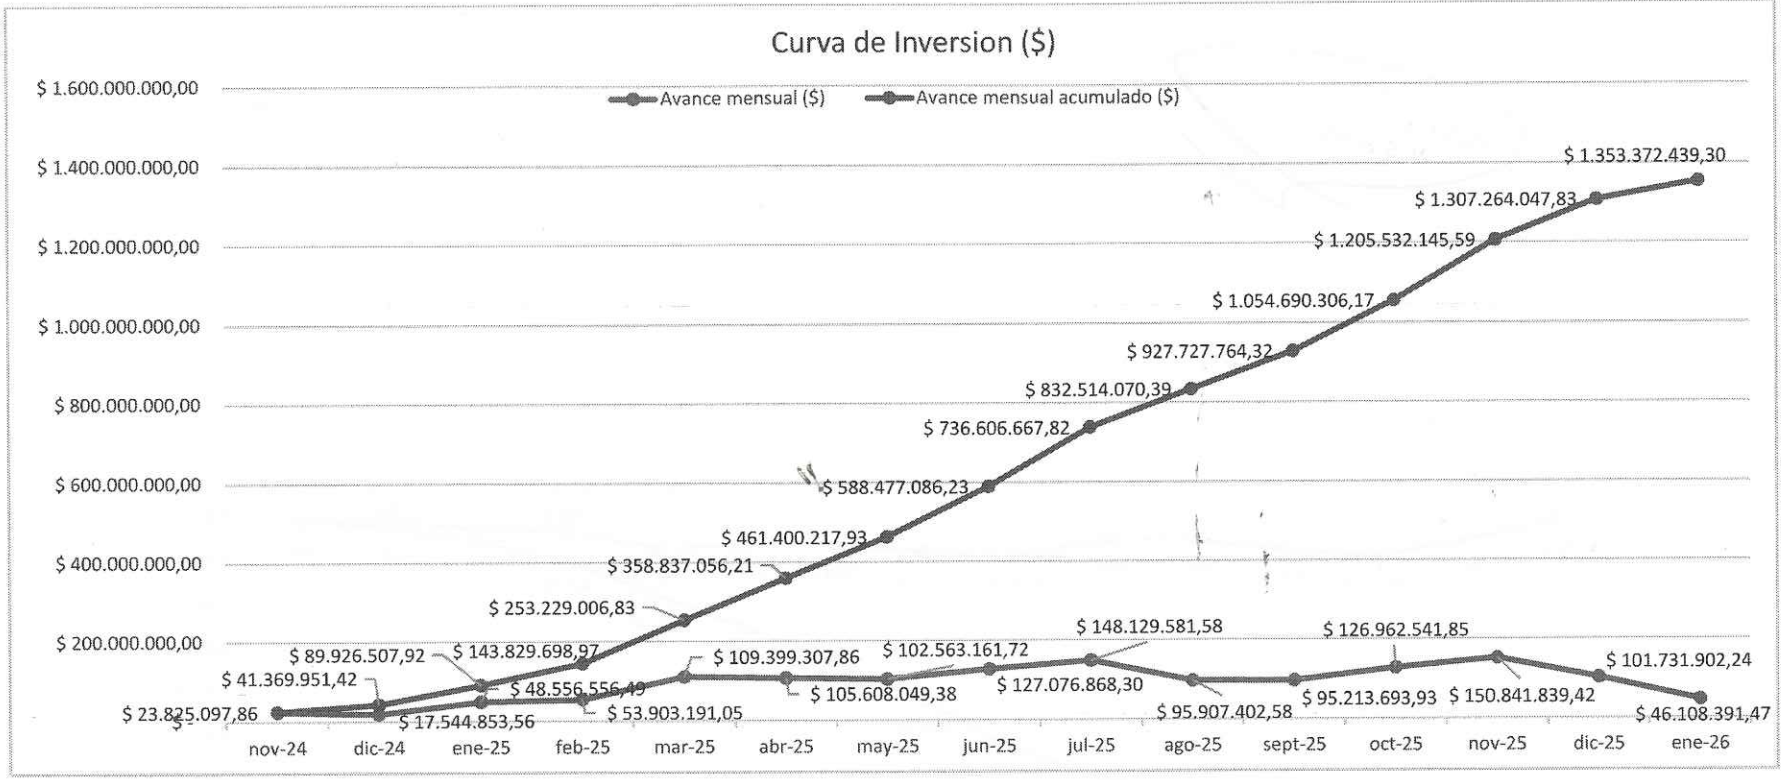

LEYMER S.A.
FEDERICO PODESTÁ CASTRO
APODERADO

OA70145 - Red Secundaria de Agua - Ituzaingó 3A Etapa 1 y 2 - Lote 1, Partido de Ituzaingó.

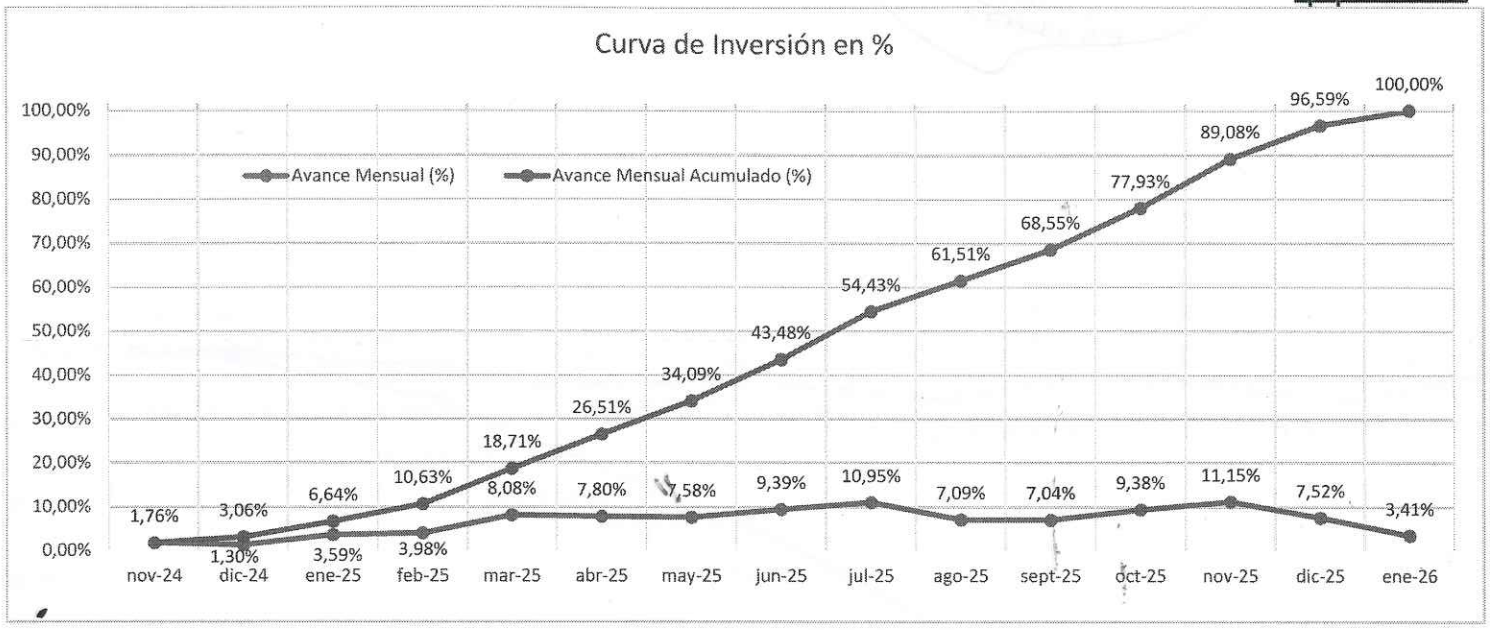

LEYMER S.A.
FEDERICO PODESTÁ CASTRO
APODERADO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2025-Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2025-36443384-GDEBA-DEODPAYCMIYSPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 8 de Octubre de 2025

Referencia: PT y CI - Modificación de obra - Ituzaingó - Lote 1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2025.10.08 16:45:25 -03'00'

Fernando Beninato
Inspector de Obra
Dirección Ejecutiva de Obras de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2025.10.08 16:45:26 -03'00'
