PLAN DE TRABAJO

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Nº	ITEM	Ud	TOTAL	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24
1	Traslado de equipos e Instalación de Obrador	Gl	$ 61,180,222.36	30.00 %	40.00 %	30.00 %													
				$18,354,066.71	$24,472,088.94	$ 18,354,066.71	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	Conformación de Terraplén	ml	$1,260,569,546.60		4.00 %	5.00 %	6.00 %	10.00 %	12.00 %	14.00 %	14.00 %					14.00 %	12.00 %	9.00 %	
				$ -	$50,422,781.86	$ 63,028,477.33	$ 75,634,172.80	$126,056,954.66	$151,268,345.59	$176,479,736.52	$176,479,736.52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 176,479,736.52	$ 151,268,345.59	$ 113,451,259.19	$ -
3	Adecuación de obra de regulación balneario Hm 420	Gl	$ 52,735,171.79					10.00 %	25.00 %	30.00 %	25.00 %				10.00 %				
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,273,517.18	$ 13,183,792.95	$ 15,820,551.54	$ 13,183,792.95	$ -	$ -	$ -	$ 5,273,517.18	$ -	$ -	$ -	$ -
4	Remoción de puentes en Hm. 602 y Hm. 1220	Gl	$ 3,731,881.15				50.00 %	50.00 %											
				$ -	$ -	$ -	$ 1,865,940.58	$ 1,865,940.58	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	Suma Provisional	Gl	$ 18,683,800.00	8.00 %	8.00 %	8.00 %	8.00 %	9.00 %	9.00 %	9.00 %	9.00 %					8.00 %	8.00 %	8.00 %	8.00 %
				$ 1,494,888.00	$ 1,494,888.00	$ 1,494,888.00	$ 1,494,888.00	$ 1,881,524.00	$ 1,881,524.00	$ 1,881,524.00	$ 1,881,524.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,494,888.00	$ 1,494,888.00	$ 1,494,888.00	$ 1,494,888.00
6	Refacciones ymodificaciones a realizar en las instalaciones del departamento zona VIII	Gl	$ 21,879,140.07								10.00 %					30.00 %	20.00 %	15.00 %	25.00 %
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,187,914.01	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,563,742.02	$ 4,375,828.01	$ 3,281,871.01	$ 5,469,785.02
7	Alcantarilla ingreso canal la Picasa Hm 428 canal 9 Dolores	Gl	$ 33,474,497.99								10.00 %					30.00 %	20.00 %	10.00 %	30.00 %
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,347,449.80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,042,349.40	$ 6,694,899.60	$ 3,347,449.80	$ 10,042,349.40
8	Relevamiento topográfico del canal gualicho , zapallar y camarones entre el hm. 1663.32 yel río salado, niveles yplanimetría	Gl	$ 30,814,839.36			30.00 %	60.00 %	10.00 %											
				$ -	$ -	$ 9,244,451.81	$ 18,488,903.62	$ 3,081,483.94	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9	Honorarios Profesionales	Gl	$ 15,465,343.50	1.34%	5.15 %	6.21 %	6.57 %	9.30 %	11.20 %	13.08 %	13.28 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.36 %	13.12 %	11.05 %	8.20 %	1.15 %
				$ 206,981.52	$ 796,585.33	$ 960,838.90	$ 1,016,552.66	$ 1,438,830.78	$ 1,732,430.98	$ 2,022,829.66	$ 2,053,056.13	$ -	$ -	$ -	$ 54,991.89	$ 2,029,072.91	$ 1,708,447.76	$ 1,267,778.95	$ 177,346.03
% DE OBRA EJECUTADA (*)			66.49%	1.34%	5.15 %	6.21 %	6.57 %	9.30 %	11.20 %	13.08 %	13.28 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.36 %	13.12 %	11.05 %	8.20 %	1.15 %
% DE OBRA ACUMULADA				1.34%	6.49 %	12.70 %	19.27 %	28.58 %	39.78 %	52.86 %	66.13 %	66.13 %	66.13 %	66.13 %	66.49 %	79.61 %	90.66 %	98.85 %	100.00 %
MONTO DE CERTIFICACION MENSUAL (*)			$ 996,355,029.61	$20,055,736.23	$77,186,144.14	$ 93,082,322.75	$ 98,500,157.65	$139,397,951.13	$167,866,093.52	$196,004,641.72	$198,933,473.41	$ -	$ -	$ -	$ 5,328,509.07	$ 196,609,588.85	$ 165,542,208.96	$ 122,843,046.96	$ 17,184,168.45
MONTO CERTIFICACION ACUMULADA				$20,055,736.23	$97,241,880.36	$190,324,203.11	$288,824,360.76	$428,222,311.89	$596,088,405.41	$792,093,047.13	$991,026,520.53	$991,026,520.53	$991,026,520.53	$991,026,520.53	$996,355,029.61	$1,192,964,618.46	$1,358,506,827.42	$1,481,349,874.37	$1,498,534,042.82


(*) Plan de Trabajo y curva de Inversion estimados.

Ing. Adrian Martin

PLAN DE TRABAJO

Nº	ITEM	Ud	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24
1	Traslado de equipos e Instalación de Obrador	Gl	30.00%	40.00%	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	Conformación de Terraplén	ml	0.00%	4.00%	5.00%	6.00%	10.00%	12.00%	14.00%	14.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.00%	12.00%	9.00%	0.00%
3	Adecuación de obra de regulación balneario Hm 420	Gl	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	25.00%	30.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	Remoción de puentes en Hm. 602 y Hm. 1220	Gl	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	Suma Provisional	Gl	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
6	Refacciones y modificaciones a realizar en las instalaciones del departamento zona VIII	Gl	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.00%	20.00%	15.00%	25.00%
7	Alcantarilla ingreso canal la Picasa Hm 428 canal 9 Dolores	Gl	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.00%	20.00%	10.00%	30.00%
8	Relevamiento topográfico del canal gualicho, zapallar y camarones entre el hm. 1663.32 y el río salado, niveles y planimetría	Gl	0.00%	0.00%	30.00%	60.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
9	Honorarios Profesionales	Gl	1.34%	5.15%	6.21%	6.57%	9.30%	11.20%	13.08%	13.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.36%	13.12%	11.05%	8.20%	1.15%
% DE OBRA EJECUTADA (*)			1.34%	5.15%	6.21%	6.57%	9.30%	11.20%	13.08%	13.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.36%	13.12%	11.05%	8.20%	1.15%
% DE OBRA ACUMULADA			1.34%	6.49%	12.70%	19.27%	28.58%	39.78%	52.86%	66.13%	66.13%	66.13%	66.13%	66.49%	79.61%	90.66%	98.85%	100.00%

(*) Plan de Trabajo y curva de Inversión estimados.

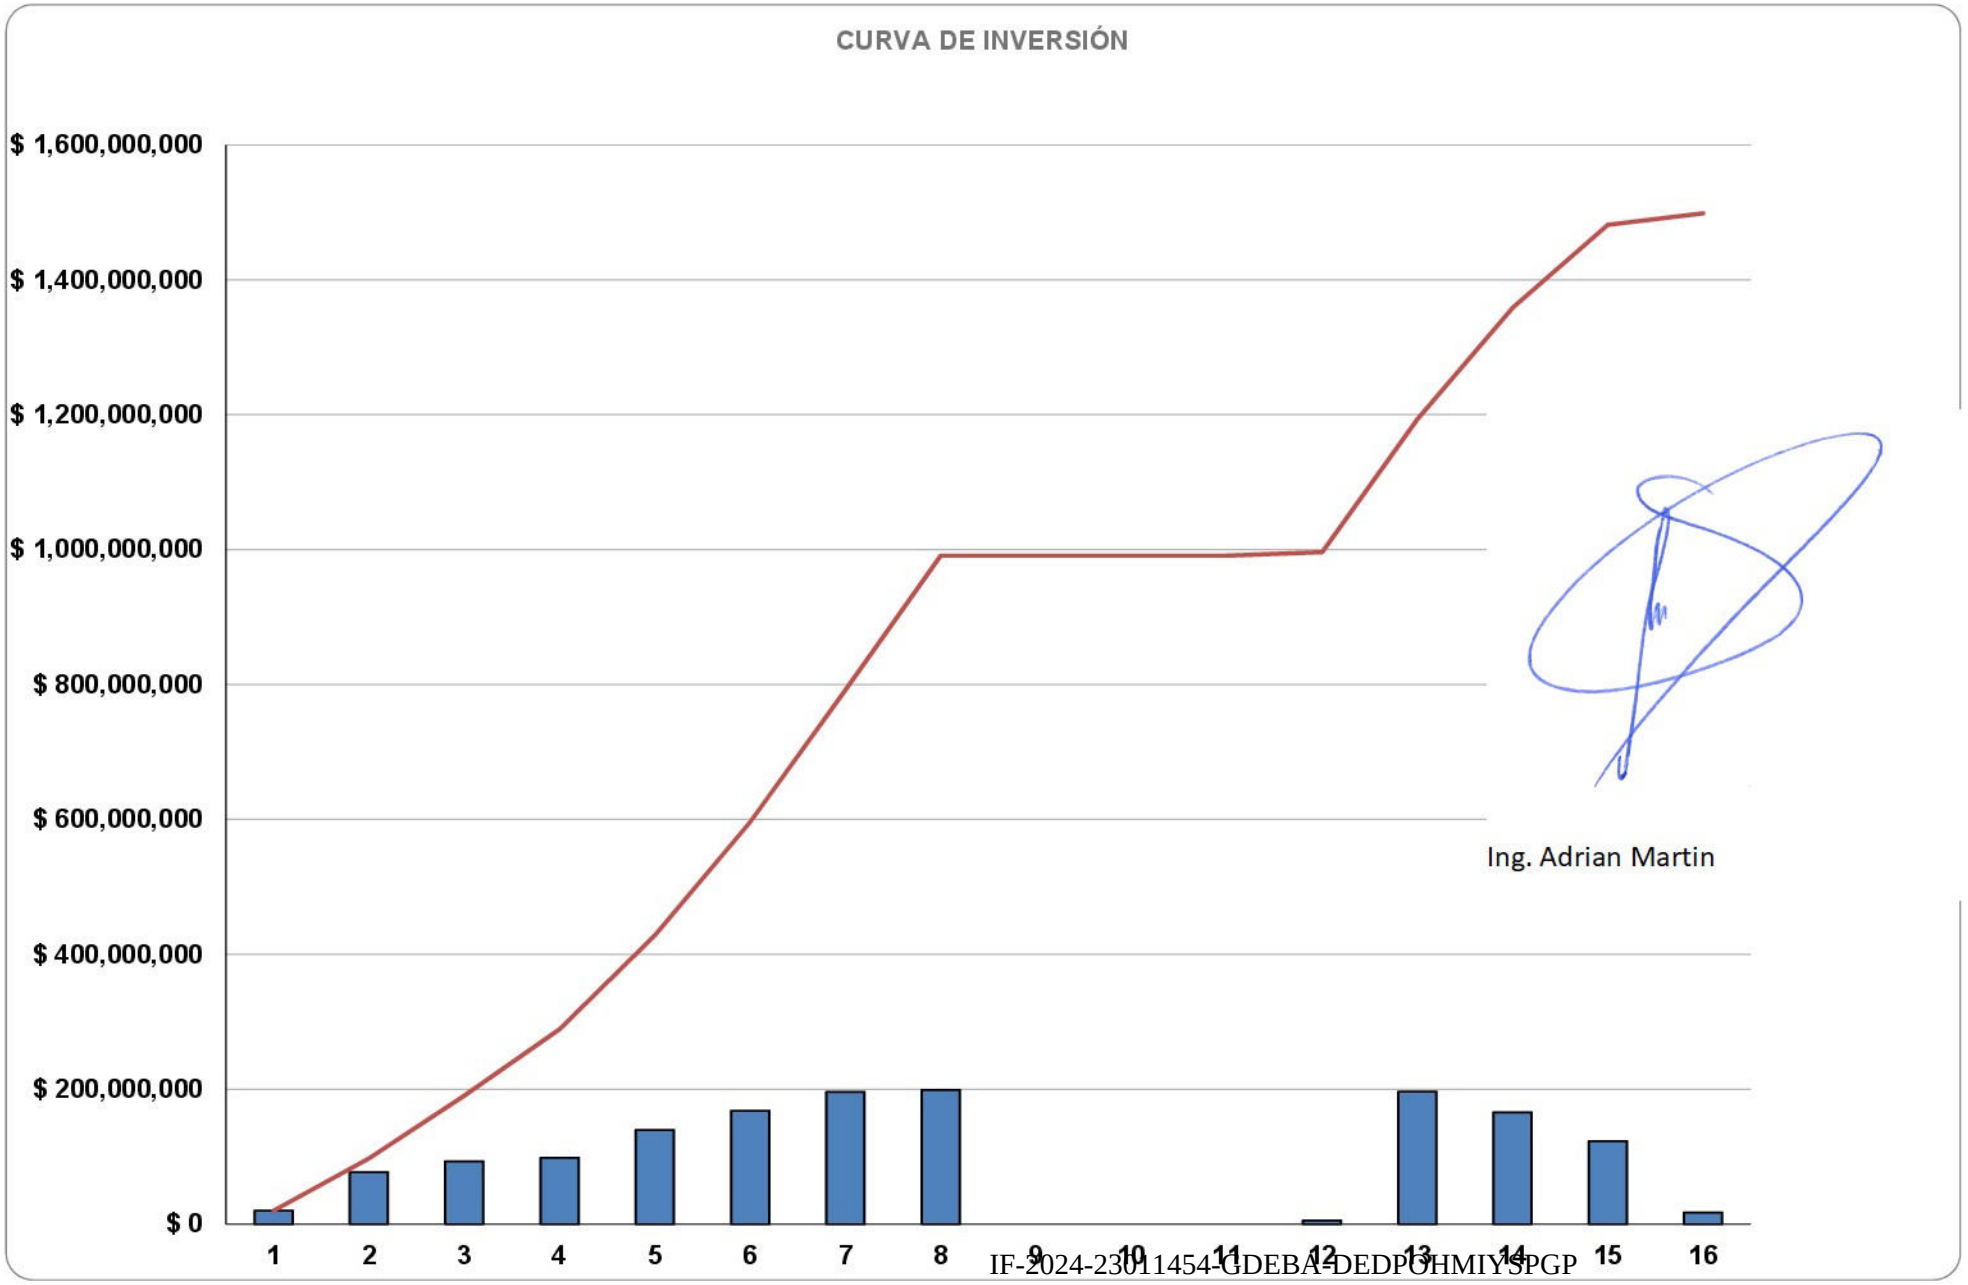

Ing. Adrian Martin

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 75° Aniversario de la gratuidad universitaria en la República Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-23011454-GDEBA-DEDPOHMIYSPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 2 de Julio de 2024

Referencia: Plan de trabajos "Terraplentamiento de canal 9 y obras accesorias

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2024.07.02 15:36:59 -03'00'

Damian Portiansky
Personal Profesional
Dirección Ejecutiva
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2024.07.02 15:37:00 -03'00'
