FOLIO Nº 088

Plan de Trabajos.	5

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 95581 - LEY 5140

ECOSUR BAHIA S.A.
Lic. DIEGO PABLO MOGUILANSKY
PRESIDENTE

ECOSUR BAHIA S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

coince

ECOSUR BAHIA S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

coince

Licitación Pública Internacional 8/21

PLAN DE TRABAJOS PORCENTUALIZADO

Nro.	DESCRIPCIÓN	Un	Cant	1	2	3	4	5	6	7
L1	**Lote 1 – Módulo 6**									
L1-1	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	global	1.00	8.00%	8.00%	8.00%	7.00%	8.00%	8.00%	8.00%
L1-2	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROYECTO EJECUTIVO	global	1.00	48.00%	52.00%					
L1-3	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS**									
L1-3.1	Cañería PEAD PE 80 PN 10 diámetro 90 mm	m	5,290.00			10.10%	9.62%	11.06%	10.10%	10.58%
L1-3.2	Cañería PEAD PE 80 PN 10 diámetro 160 mm	m	1,810.00			10.10%	9.61%	11.06%	10.10%	10.58%
L1-4	**EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS**									
L1-4.1	Excavación y relleno para cañerías DN menor a 160mm	m3	3,070.00			10.10%	9.62%	11.06%	10.10%	10.58%
L1-4.2	Excavación y relleno para cañerías DN mayor o igual a 160mm	m3	1,370.00			10.10%	9.62%	11.06%	10.10%	10.58%
L1-5	**EMPALMES**									
L1-5.1	Empalmes	unidad	34.00			10.09%	9.59%	11.03%	10.09%	10.56%
L1-5.2	Desempalmes	unidad	16.00			10.06%	9.56%	11.00%	10.06%	10.56%
L1-6	**CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA**									
L1-6.1	Conexiones cortas	unidad	441.00			10.10%	9.61%	11.06%	10.10%	10.58%
L1-7	**LEVANTAMIENTO Y REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS**									
L1-7.1	Levantamiento y reparación de veredas	m2	2,720.00			10.10%	9.62%	11.06%	10.10%	10.58%
L1-7.2	Levantamiento y reparación de pavimentos	m2	610.00			10.10%	9.61%	11.06%	10.10%	10.58%
L1-8	**VÁLVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASOCIADAS**									
L1-8.1	Hidrantes	unidad	4.00			10.00%	9.50%	11.00%	10.00%	10.50%
L1-8.2	Válvula esclusa DN 90	unidad	14.00			10.07%	9.57%	11.00%	10.07%	10.57%
L1-8.3	Válvula esclusa DN 160	unidad	9.00			10.00%	9.56%	11.00%	10.00%	10.56%
L1-9	HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA	global	1.00	8.00%	8.00%	8.00%	7.00%	8.00%	8.00%	8.00%
				3.67%	**3.94%**	**9.29%**	**8.81%**	**10.13%**	**9.29%**	**9.71%**
				3.67%	**7.61%**	**16.90%**	**25.71%**	**35.84%**	**45.13%**	**54.84%**

IF-2024-08929893-GDEBA-DPAYCMIYSPGP

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 36580 LEY 5140

ECOSUR BAHIA S.A.
LIC. DIEGO PABLO MOGUILIANSKY
PRESIDENTE

FOLIO Nº 089

8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	13.00%				
10.58%	10.10%	11.06%	10.58%	6.25%				
10.58%	10.10%	11.06%	10.58%	6.25%				
10.58%	10.10%	11.06%	10.58%	6.25%				
10.58%	10.10%	11.06%	10.58%	6.25%				
10.56%	10.09%	11.03%	10.56%	6.41%				
10.56%	10.06%	11.00%	10.56%	6.56%				
10.58%	10.10%	11.06%	10.58%	6.26%				
10.58%	10.10%	11.06%	10.58%	6.25%				
10.58%	10.10%	11.06%	10.58%	6.26%				
10.50%	10.00%	11.00%	10.50%	7.00%				
10.57%	10.07%	11.00%	10.57%	6.50%				
10.56%	10.00%	11.00%	10.56%	6.78%				
8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	13.00%				
9.71%	**9.29%**	**10.13%**	**9.71%**	**6.31%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
64.56%	**73.85%**	**83.98%**	**93.69%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 36591 - LEY 5140

ECOSUR BAHIA S.A.
Lic. DIEGO PABLO MOGUILIANSKY
PRESIDENTE

FOLIO Nº 060

IF-2024-08929893-GDEBA-DPAYCMIYSPGP

ECOSUR BAHIA S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

coince

Licitación Pública Internacional 8/21

PLAN DE TRABAJOS PORCENTUALIZADO

Nro.	DESCRIPCIÓN	Un	Cant	1	2	3	4	5	6	7	8
L2	**Lote 2 – Módulo 7**										
L2-1	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	global	1.00	6.00%	6.00%	6.00%	5.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
L2-2	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROYECTO EJECUTIVO	global	1.00	50.00%	50.00%						
L2-3	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS**										
L2-3.1	Cañería PEAD PE 80 PN 10 diámetro 90 mm	m	8,340.00		0.34%	7.19%	6.85%	7.88%	7.19%	7.53%	7.53%
L2-3.2	Cañería PEAD PE 80 PN 10 diámetro 200 mm	m	780.00		0.34%	7.19%	6.85%	7.88%	7.19%	7.53%	7.53%
L2-3.3	Cañería PEAD PE 80 PN 10 diámetro 250 mm	m	1,030.00		0.34%	7.19%	6.85%	7.88%	7.19%	7.53%	7.53%
L2-4	**EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS**										
L2-4.1	Excavación y relleno para cañerías DN menor a 160mm	m3	4,840.00		0.34%	7.19%	6.85%	7.88%	7.19%	7.53%	7.53%
L2-4.2	Excavación y relleno para cañerías DN mayor o igual a 160mm	m3	1,600.00		0.34%	7.19%	6.85%	7.88%	7.19%	7.53%	7.53%
L2-5	**EMPALMES**										
L2-5.1	Empalmes	unidad	40.00		0.33%	7.13%	6.80%	7.80%	7.13%	7.48%	7.48%
L2-5.2	Desempalmes	unidad	23.00		0.30%	7.13%	6.78%	7.78%	7.13%	7.48%	7.48%
L2-6	**CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA**										
L2-6.1	Conexiones cortas	unidad	846.00		0.34%	7.14%	6.80%	7.82%	7.14%	7.48%	7.48%
L2-7	**LEVANTAMIENTO Y REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS**										
L2-7.1	Levantamiento y reparación de veredas	m2	3,910.00		0.34%	7.14%	6.80%	7.82%	7.14%	7.48%	7.48%
L2-7.2	Levantamiento y reparación de pavimentos	m2	870.00		0.34%	7.14%	6.80%	7.82%	7.14%	7.48%	7.48%
L2-8	**VÁLVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASOCIADAS**										
L2-8.1	Hidrantes	unidad	3.00		0.33%	7.00%	6.67%	7.67%	7.00%	7.33%	7.33%
L2-8.2	Válvula esclusa DN 90	unidad	30.00		0.33%	7.13%	6.80%	7.80%	7.13%	7.47%	7.47%
L2-8.3	Válvula esclusa DN 200	unidad	3.00		0.33%	7.00%	6.67%	7.67%	7.00%	7.33%	7.33%
L2-8.4	Válvula esclusa DN 250	unidad	2.00		0.00%	7.00%	6.50%	7.50%	7.00%	7.50%	7.50%
L2-9	HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA	global	1.00	6.00%	6.00%	6.00%	5.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
				3.60%	**3.90%**	**6.63%**	**6.28%**	**7.23%**	**6.63%**	**6.93%**	**6.93%**
				3.60%	**7.50%**	**14.13%**	**20.41%**	**27.64%**	**34.27%**	**41.21%**	**48.14%**

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 38567 - LEY 5140

ECOSUR BAHIA S.A.
Lic. DIEGO PABLO MOGUILIANSKY
PRESIDENTE

FOLIO Nº

IF-2024-08929893-GDEBA-DPAYCMIYSPGP

9	10	11	12	13	14	15	16
6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	11.00%
7.19%	7.88%	7.53%	7.19%	7.53%	7.53%	7.53%	3.08%
7.19%	7.88%	7.53%	7.19%	7.53%	7.53%	7.53%	3.09%
7.19%	7.88%	7.53%	7.19%	7.53%	7.53%	7.53%	3.09%
7.19%	7.88%	7.53%	7.19%	7.53%	7.53%	7.53%	3.08%
7.19%	7.88%	7.53%	7.19%	7.53%	7.53%	7.53%	3.09%
7.13%	7.80%	7.48%	7.13%	7.48%	7.48%	7.48%	3.93%
7.13%	7.78%	7.48%	7.13%	7.48%	7.48%	7.48%	3.96%
7.14%	7.82%	7.48%	7.14%	7.48%	7.48%	7.48%	3.75%
7.14%	7.82%	7.48%	7.14%	7.48%	7.48%	7.48%	3.74%
7.14%	7.82%	7.48%	7.14%	7.48%	7.48%	7.48%	3.75%
7.00%	7.67%	7.33%	7.00%	7.33%	7.33%	7.33%	5.67%
7.13%	7.80%	7.47%	7.13%	7.47%	7.47%	7.47%	3.93%
7.00%	7.67%	7.33%	7.00%	7.33%	7.33%	7.33%	5.67%
7.00%	7.50%	7.50%	7.00%	7.50%	7.50%	7.50%	5.50%
6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	11.00%
6.63%	**7.23%**	**6.93%**	**6.63%**	**6.93%**	**6.93%**	**6.93%**	**3.63%**
54.77%	**62.00%**	**68.94%**	**75.57%**	**82.50%**	**89.44%**	**96.37%**	**100.00%**

IF-2024-08929893-GDEBA-DPAYCMIYSPGP

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT 36511 - LEY 5140

ECOSUR BAHIA S.A.
Lic. DIEGO PABLO MOGILIANSKY
PRESIDENTE

FOLIO Nº 260

ECOSUR BAHIA S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

coince

Licitación Pública Internacional 8/21

PLAN DE TRABAJOS PORCENTUALIZADO

Nro.	DESCRIPCIÓN	Un	Cant	1	2	3	4	5	6
L3	**Lote 3 – Módulo 8**								
L3-1	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	global	1.00	6.00%	6.00%	6.00%	5.00%	6.00%	6.00%
L3-2	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROYECTO EJECUTIVO	global	1.00	50.00%	50.00%				
L3-3	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS**								
L3-3.1	Cañería PEAD PE 80 PN 10 diámetro 90 mm	m	7,730.00		0.34%	7.19%	6.85%	7.88%	7.19%
L3-3.2	Cañería PEAD PE 80 PN 10 diámetro 110 mm	m2	1,150.00		0.34%	7.19%	6.85%	7.88%	7.19%
L3-4	**EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS**								
L3-4.1	Excavación y relleno para cañerías DN menor a 160mm	m3	5,190.00		0.34%	7.19%	6.85%	7.88%	7.19%
L3-5	**EMPALMES**								
L3-5.1	Empalmes	unidad	65.00		0.34%	7.14%	6.80%	7.82%	7.14%
L3-5.2	Desempalmes	unidad	37.00		0.32%	7.19%	6.84%	7.86%	7.19%
L3-6	**CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA**								
L3-6.1	Conexiones cortas	unidad	645.00		0.34%	7.14%	6.80%	7.82%	7.14%
L3-7	**LEVANTAMIENTO Y REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS**								
L3-7.1	Levantamiento y reparación de veredas	m2	3,200.00		0.34%	7.17%	6.83%	7.85%	7.17%
L3-7.2	Levantamiento y reparación de pavimentos	m2	720.00		0.34%	7.14%	6.80%	7.82%	7.14%
L3-8	**VÁLVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASOCIADAS**								
L3-8.1	Hidrantes	unidad	5.00		0.20%	7.00%	6.80%	7.80%	7.00%
L3-8.2	Válvula esclusa DN 90	unidad	39.00		0.33%	7.13%	6.79%	7.82%	7.13%
L3-8.3	Válvula esclusa DN 110	unidad	1.00		0.00%	7.00%	6.00%	7.00%	7.00%
L3-9	HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA	global	1.00	6.00%	6.00%	6.00%	5.00%	6.00%	6.00%
				3.65%	**3.95%**	**6.63%**	**6.27%**	**7.22%**	**6.63%**
				3.65%	**7.60%**	**14.23%**	**20.49%**	**27.72%**	**34.34%**

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 368181 - LEY 5140

ECOSUR BAHIA S.A.
DIEGO PABLO MUSZILIANSKY
PRESIDENTE

FOLIO Nº 092

IF-2024-08929893-GDEBA-DPAYCMIYSPGP

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	11.00%
7.53%	7.53%	7.19%	7.88%	7.53%	7.19%	7.53%	7.53%	7.53%	3.08%
7.53%	7.53%	7.19%	7.88%	7.53%	7.19%	7.53%	7.53%	7.53%	3.09%
7.53%	7.53%	7.19%	7.88%	7.53%	7.19%	7.53%	7.53%	7.53%	3.08%
7.48%	7.48%	7.14%	7.82%	7.48%	7.14%	7.48%	7.48%	7.48%	3.82%
7.51%	7.51%	7.19%	7.86%	7.51%	7.19%	7.51%	7.51%	7.51%	3.27%
7.48%	7.48%	7.14%	7.82%	7.48%	7.14%	7.48%	7.48%	7.48%	3.75%
7.51%	7.51%	7.17%	7.85%	7.51%	7.17%	7.51%	7.51%	7.51%	3.41%
7.48%	7.48%	7.14%	7.82%	7.48%	7.14%	7.48%	7.48%	7.48%	3.76%
7.40%	7.40%	7.00%	7.80%	7.40%	7.00%	7.40%	7.40%	7.40%	5.00%
7.46%	7.46%	7.13%	7.82%	7.46%	7.13%	7.46%	7.46%	7.46%	3.95%
7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	10.00%
6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	11.00%
6.92%	**6.92%**	**6.63%**	**7.22%**	**6.92%**	**6.63%**	**6.92%**	**6.92%**	**6.92%**	**3.65%**
41.26%	**48.19%**	**54.81%**	**62.03%**	**68.96%**	**75.58%**	**82.51%**	**89.43%**	**96.35%**	**100.00%**

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 36580 - LEY 5140

ECOCSA BAHIA S.A.
Ing. DIEGO PABLO BOGUILANSKY
PRESIDENTE

FOLIO Nº 760

IF-2024-08929893-GDEBA-DPAYCMIYSPGP

ECOSUR BAHIA S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

coince

Licitación Pública Internacional 8/21

PLAN DE TRABAJOS PORCENTUALIZADO

Nro.	DESCRIPCIÓN	Un	Cant	1	2	3	4	5	6	7
L4	**Lote 4 – Módulo 9**									
L4-1	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	global	1.00	6.00%	6.00%	6.00%	5.00%	6.00%	6.00%	6.00%
L4-2	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROYECTO EJECUTIVO	global	1.00	50.00%	50.00%					
L4-3	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS**									
L4-3.1	Cañería PEAD PE 80 PN 10 diámetro 90 mm	m	9,100.00		0.34%	7.19%	6.85%	7.88%	7.19%	7.53%
L4-3.2	Cañería PEAD PE 80 PN 10 diámetro 110 mm	m	360.00		0.34%	7.19%	6.85%	7.88%	7.19%	7.53%
L4-3.3	Cañería PEAD PE 80 PN 10 diámetro 160 mm	m	800.00		0.40%	8.40%	8.00%	9.20%	8.40%	8.80%
L4-4	**EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS**									
L4-4.1	Excavación y relleno para cañerías DN menor a 160mm	m3	5,530.00		0.34%	7.19%	6.85%	7.88%	7.19%	7.53%
L4-4.2	Excavación y relleno para cañerías DN mayor o igual a 160mm	m3	610.00		0.34%	7.19%	6.85%	7.88%	7.19%	7.53%
L4-5	**EMPALMES**									
L4-5.1	Empalmes	unidad	56.00		0.34%	7.18%	6.84%	7.88%	7.18%	7.52%
L4-5.2	Desempalmes	unidad	39.00		0.33%	7.15%	6.82%	7.85%	7.15%	7.49%
L4-6	**CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA**									
L4-6.1	Conexiones cortas	unidad	855.00		0.34%	7.14%	6.80%	7.82%	7.14%	7.48%
L4-7	**LEVANTAMIENTO Y REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS**									
L4-7.1	Levantamiento y reparación de veredas	m2	3,770.00		0.34%	7.14%	6.80%	7.82%	7.14%	7.48%
L4-7.2	Levantamiento y reparación de pavimentos	m2	840.00		0.34%	7.14%	6.80%	7.82%	7.14%	7.48%
L4-8	**VÁLVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASOCIADAS**									
L4-8.1	Hidrantes	unidad	3.00		0.33%	7.00%	6.67%	7.67%	7.00%	7.33%
L4-8.2	Válvula esclusa DN 90	unidad	40.00		0.33%	7.13%	6.80%	7.80%	7.13%	7.48%
L4-9	HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA	global	1.00	6.00%	6.00%	6.00%	5.00%	6.00%	6.00%	6.00%
				3.42%	**3.73%**	**6.71%**	**6.35%**	**7.32%**	**6.71%**	**7.01%**
				3.42%	**7.15%**	**13.86%**	**20.21%**	**27.53%**	**34.24%**	**41.26%**

IF-2024-08929893-GDEBA-DPAYCMIYSPGP

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 36561 - LEY 51

ECOSUR BAHIA S.A.
Lic. PABLO MIGUILIANSKY
PRESIDENTE

FOLIO Nº 095

8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	11.00%
7.53%	7.19%	7.88%	7.53%	7.19%	7.53%	7.53%	7.53%	3.08%
7.53%	7.19%	7.88%	7.53%	7.19%	7.53%	7.53%	7.53%	3.09%
8.80%	8.40%	9.20%	8.80%	8.40%	8.80%	4.40%		
7.53%	7.19%	7.88%	7.53%	7.19%	7.53%	7.53%	7.53%	3.08%
7.53%	7.19%	7.88%	7.53%	7.19%	7.53%	7.53%	7.53%	3.10%
7.52%	7.18%	7.88%	7.52%	7.18%	7.52%	7.52%	7.52%	3.25%
7.49%	7.15%	7.85%	7.49%	7.15%	7.49%	7.49%	7.49%	3.62%
7.48%	7.14%	7.82%	7.48%	7.14%	7.48%	7.48%	7.48%	3.75%
7.48%	7.14%	7.82%	7.48%	7.14%	7.48%	7.48%	7.48%	3.74%
7.48%	7.14%	7.82%	7.48%	7.14%	7.48%	7.48%	7.48%	3.75%
7.33%	7.00%	7.67%	7.33%	7.00%	7.33%	7.33%	7.33%	5.67%
7.48%	7.13%	7.80%	7.48%	7.13%	7.48%	7.48%	7.48%	3.93%
6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	11.00%
7.01%	**6.71%**	**7.32%**	**7.01%**	**6.71%**	**7.01%**	**6.83%**	**6.64%**	**3.49%**
48.27%	**54.98%**	**62.30%**	**69.32%**	**76.03%**	**83.04%**	**89.87%**	**96.51%**	**100.00%**

IF-2024-08929893-GDEBA-DPAYCMIYSPGP

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 36561 - LEY 5140

ECOSUR BAHIA S.A.
Lic. DIEGO PABLO NIKOLAJANSKY
PRESIDENTE

FOLIO Nº 096

ECOSUR BAHIA S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

coince

Licitación Pública Internacional 8/21

PLAN DE TRABAJOS PORCENTUALIZADO

Nro.	DESCRIPCIÓN	Un	Cant	1	2	3	4	5
L5	**Lote 5 – Módulo 10**							
L5-1	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	global	1.00	8.00%	8.00%	8.00%	7.00%	8.00%
L5-2	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROYECTO EJECUTIVO	global	1.00	50.00%	50.00%			
L5-3	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS**							
L5-3.1	Cañería PEAD PE 80 PN 10 diámetro 90 mm	m	6,900.00		1.44%	10.10%	9.62%	11.06%
L5-4	**EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS**							
L5-4.1	Excavación y relleno para cañerías DN menor a 160mm	m3	4,010.00		0.49%	10.19%	9.71%	11.16%
L5-5	**EMPALMES**							
L5-5.1	Empalmes	unidad	17.00		0.47%	10.12%	9.65%	11.06%
L5-5.2	Desempalmes	unidad	16.00		0.44%	10.13%	9.63%	11.06%
L5-6	**CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA**							
L5-6.1	Conexiones cortas	unidad	575.00		0.48%	10.14%	9.66%	11.11%
L5-7	**LEVANTAMIENTO Y REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS**							
L5-7.1	Levantamiento y reparación de veredas	m2	2,490.00		0.48%	10.14%	9.66%	11.11%
L5-7.2	Levantamiento y reparación de pavimentos	m2	560.00		0.48%	10.14%	9.66%	11.11%
L5-8	**VÁLVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASOCIADAS**							
L5-8.1	Hidrantes	unidad	10.00		0.40%	10.10%	9.60%	11.10%
L5-8.2	Válvula esclusa DN 90	unidad	7.00		0.43%	10.14%	9.57%	11.00%
L5-9	HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA	global	1.00	8.00%	8.00%	8.00%	7.00%	8.00%
				3.75%	**4.42%**	**9.34%**	**8.85%**	**10.18%**
				3.75%	**8.16%**	**17.51%**	**26.36%**	**36.54%**

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 36961 - LEY 5140

ECOSUR BAHIA S.A.
Lic. DIEGO PABLO MOSCHIANSKY
PRESIDENTE

FOLIO Nº 97

IF-2024-08929893-GDEBA-DPAYCMIYSPGP

6	7	8	9	10	11	12
8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	13.00%
10.10%	10.58%	10.58%	10.10%	11.06%	10.58%	4.81%
10.19%	10.68%	10.68%	10.19%	11.16%	10.68%	4.86%
10.12%	10.59%	10.59%	10.12%	11.06%	10.59%	5.65%
10.13%	10.63%	10.63%	10.13%	11.06%	10.63%	5.56%
10.14%	10.63%	10.63%	10.14%	11.11%	10.63%	5.32%
10.14%	10.63%	10.63%	10.14%	11.11%	10.63%	5.32%
10.14%	10.63%	10.63%	10.14%	11.11%	10.63%	5.32%
10.10%	10.60%	10.60%	10.10%	11.10%	10.60%	5.70%
10.14%	10.57%	10.57%	10.14%	11.00%	10.57%	5.86%
8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	13.00%
9.34%	**9.76%**	**9.76%**	**9.34%**	**10.18%**	**9.76%**	**5.32%**
45.88%	**55.64%**	**65.40%**	**74.74%**	**84.92%**	**94.68%**	**100.00%**

IF-2024-08929893-GDEBA-DPAYCMIYSPGP

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 36567 - LEY 5140

ECOSISTEMIA S.A.
LIC. DIEGO PABLO MOSCHIANSKY
PRESIDENTE

FOLIO Nº 090

ECOSUR BAHIA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

coince

Licitación Pública Internacional 8/21

PLAN DE TRABAJOS VALORIZADO

Nro.	DESCRIPCIÓN	Un	Cant	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
L1	**Lote 1 – Módulo 6**													
L1-1	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	global	1.00	8.00% $ 113,911.22	8.00% $ 113,911.22	8.00% $ 113,911.22	7.00% $ 99,672.31	8.00% $ 113,911.22	8.00% $ 113,911.22	8.00% $ 113,911.22	8.00% $ 113,911.22	8.00% $ 113,911.22	8.00% $ 113,911.22	8.00% $ 113,911.22
L1-2	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROYECTO EJECUTIVO	global	1.00	48.00% $ 3,572,426.89	52.00% $ 3,870,129.14									
L1-3	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS**													
L1-3.1	Cañería PEAD PE 80 PN 10 diámetro 90 mm	m	5,290.00			10.10% $ 1,964,218.06	9.62% $ 1,870,692.62	11.06% $ 2,151,305.71	10.10% $ 1,964,218.06	10.58% $ 2,057,743.50	10.58% $ 2,057,743.50	10.10% $ 1,964,218.06	11.06% $ 2,151,305.71	10.58% $ 2,057,743.50
L1-3.2	Cañería PEAD PE 80 PN 10 diámetro 160 mm	m	1,810.00			10.10% $ 1,539,420.03	9.61% $ 1,466,046.12	11.06% $ 1,685,999.37	10.10% $ 1,539,420.03	10.58% $ 1,612,709.70	10.58% $ 1,612,709.70	10.10% $ 1,539,420.03	11.06% $ 1,685,999.37	10.58% $ 1,612,709.70
L1-4	**EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS**													
L1-4.1	Excavación y relleno para cañerías DN menor a 160mm	m3	3,070.00			10.10% $ 1,219,454.88	9.62% $ 1,161,383.73	11.06% $ 1,335,597.19	10.10% $ 1,219,454.88	10.58% $ 1,277,526.04	10.58% $ 1,277,526.04	10.10% $ 1,219,454.88	11.06% $ 1,335,597.19	10.58% $ 1,277,526.04
L1-4.2	Excavación y relleno para cañerías DN mayor o igual a 160mm	m3	1,370.00			10.10% $ 690,143.39	9.62% $ 657,310.31	11.06% $ 755,909.35	10.10% $ 690,143.39	10.58% $ 723,026.37	10.58% $ 723,026.37	10.10% $ 690,143.39	11.06% $ 755,909.35	10.58% $ 723,026.37
L1-5	**EMPALMES**													
L1-5.1	Empalmes	unidad	34.00			10.09% $ 500,244.10	9.59% $ 475,450.66	11.03% $ 546,914.10	10.09% $ 500,244.10	10.56% $ 523,579.10	10.56% $ 523,579.10	10.09% $ 500,244.10	11.03% $ 546,914.10	10.56% $ 523,579.10
L1-5.2	Desempalmes	unidad	16.00			10.06% $ 123,572.73	9.56% $ 117,432.47	11.00% $ 135,085.72	10.06% $ 123,572.73	10.56% $ 129,712.99	10.56% $ 129,712.99	10.06% $ 123,572.73	11.00% $ 135,085.72	10.56% $ 129,712.99
L1-6	**CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA**													
L1-6.1	Conexiones cortas	unidad	441.00			10.10% $ 1,089,247.69	9.61% $ 1,037,378.75	11.06% $ 1,192,985.56	10.10% $ 1,089,247.69	10.58% $ 1,141,116.63	10.58% $ 1,141,116.63	10.10% $ 1,089,247.69	11.06% $ 1,192,985.56	10.58% $ 1,141,116.63
L1-7	**LEVANTAMIENTO Y REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS**													
L1-7.1	Levantamiento y reparación de veredas	m2	2,720.00			10.10% $ 1,741,442.06	9.62% $ 1,658,495.11	11.06% $ 1,907,272.55	10.10% $ 1,741,442.06	10.58% $ 1,824,389.01	10.58% $ 1,824,389.01	10.10% $ 1,741,442.06	11.06% $ 1,907,272.55	10.58% $ 1,824,389.01
L1-7.2	Levantamiento y reparación de pavimentos	m2	610.00			10.10% $ 658,974.97	9.61% $ 627,620.69	11.06% $ 721,790.54	10.10% $ 658,974.97	10.58% $ 690,329.25	10.58% $ 690,329.25	10.10% $ 658,974.97	11.06% $ 721,790.54	10.58% $ 690,329.25
L1-8	**VÁLVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASOCIADAS**													
L1-8.1	Hidrantes	unidad	4.00			10.00% $ 61,028.91	9.50% $ 57,977.47	11.00% $ 67,131.80	10.00% $ 61,028.91	10.50% $ 64,080.36	10.50% $ 64,080.36	10.00% $ 61,028.91	11.00% $ 67,131.80	10.50% $ 64,080.36
L1-8.2	Válvula esclusa DN 90	unidad	14.00			10.07% $ 163,714.72	9.57% $ 155,587.04	11.00% $ 178,808.98	10.07% $ 163,714.72	10.57% $ 171,842.40	10.57% $ 171,842.40	10.07% $ 163,714.72	11.00% $ 178,808.98	10.57% $ 171,842.40
L1-8.3	Válvula esclusa DN 160	unidad	9.00			10.00% $ 193,020.75	9.56% $ 184,442.05	11.00% $ 212,322.82	10.00% $ 193,020.75	10.56% $ 203,744.12	10.56% $ 203,744.12	10.00% $ 193,020.75	11.00% $ 212,322.82	10.56% $ 203,744.12
L1-9	HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA	global	1.00	8.00% $ 481,315.00	8.00% $ 481,315.00	8.00% $ 481,315.00	7.00% $ 421,150.63	8.00% $ 481,315.00	8.00% $ 481,315.00	8.00% $ 481,315.00	8.00% $ 481,315.00	8.00% $ 481,315.00	8.00% $ 481,315.00	8.00% $ 481,315.00
				3.67%	**3.94%**	**9.29%**	**8.81%**	**10.13%**	**9.29%**	**9.71%**	**9.71%**	**9.29%**	**10.13%**	**9.71%**
				3.67%	**7.61%**	**16.90%**	**25.71%**	**35.84%**	**45.13%**	**54.84%**	**64.56%**	**73.85%**	**83.98%**	**93.69%**
				$ 4,167,653.11	**$ 4,465,355.36**	**$ 10,539,708.51**	**$ 9,990,639.96**	**$ 11,486,349.91**	**$ 10,539,708.51**	**$ 11,015,025.69**	**$ 11,015,025.69**	**$ 10,539,708.51**	**$ 11,486,349.91**	**$ 11,015,025.69**
				$ 4,167,653.11	**$ 8,633,008.47**	**$ 19,172,716.98**	**$ 29,163,356.94**	**$ 40,649,706.85**	**$ 51,189,415.36**	**$ 62,204,441.05**	**$ 73,219,466.74**	**$ 83,759,175.25**	**$ 95,245,525.16**	**$ 106,260,550.85**

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 3656 LEY 5140

ECOSUR BAHIA S.A.
Lic. DIEGO PABLO MOGUILIANSKY
PRESIDENTE

FOLIO Nº 09

IF-2024-08929893-GDEBA-DPAYCMIYSPGP

12	13	14	15	16
13.00% $ 185,105.69				
6.25% $ 1,216,161.68				
6.25% $ 953,186.95				
6.25% $ 754,964.33				
6.25% $ 427,428.81				
6.41% $ 317,939.38				
6.56% $ 80,590.93				
6.26% $ 675,274.85				
6.25% $ 1,078,373.78				
6.26% $ 408,568.77				
7.00% $ 42,720.24				
6.50% $ 105,659.86				
6.78% $ 130,825.20				
13.00% $ 782,136.88				
6.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
$ 7,158,937.35	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
$ 113,419,488.20	$ 113,419,488.20	$ 113,419,488.20	$ 113,419,488.20	$ 113,419,488.20

IF-2024-08929893-GDEBA-DPAYCMIYSPGP

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 36581 - LEY 5140

ECOSUR BAHIA S.A.
Lic. DIEGO PABLO MOSCHIANSKY
PRESIDENTE

FOLIO Nº 100

ECOSUR BAHIA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA — coince

Licitación Pública Internacional 8/21

PLAN DE TRABAJOS VALORIZADO

Nro.	DESCRIPCIÓN	Un	Cant	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
L2	**Lote 2 – Módulo 7**															
L2-1	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	global	1.00	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	5.00% $ 83,673.05	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66
L2-2	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROYECTO EJECUTIVO	global	1.00	50.00% $ 5,626,483.23	50.00% $ 5,626,483.23											
L2-3	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS**															
L2-3.1	Cañería PEAD PE 80 PN 10 diámetro 90 mm	m	8,340.00		0.34% $ 105,036.83	7.19% $ 2,205,883.67	6.85% $ 2,100,846.84	7.88% $ 2,415,957.32	7.19% $ 2,205,883.67	7.53% $ 2,310,920.50	7.53% $ 2,310,920.50	7.19% $ 2,205,883.67	7.88% $ 2,415,957.32	7.53% $ 2,310,920.50	7.19% $ 2,205,883.67	7.53% $ 2,310,920.50
L2-3.2	Cañería PEAD PE 80 PN 10 diámetro 200 mm	m	780.00		0.34% $ 26,535.21	7.19% $ 557,438.13	6.85% $ 530,902.92	7.88% $ 610,508.54	7.19% $ 557,438.13	7.53% $ 583,973.33	7.53% $ 583,973.33	7.19% $ 557,438.13	7.88% $ 610,508.54	7.53% $ 583,973.33	7.19% $ 557,438.13	7.53% $ 583,973.33
L2-3.3	Cañería PEAD PE 80 PN 10 diámetro 250 mm	m	1,030.00		0.34% $ 60,461.39	7.19% $ 1,272,265.58	6.85% $ 1,211,632.43	7.88% $ 1,393,531.88	7.19% $ 1,272,265.58	7.53% $ 1,332,898.73	7.53% $ 1,332,898.73	7.19% $ 1,272,265.58	7.88% $ 1,393,531.88	7.53% $ 1,332,898.73	7.19% $ 1,272,265.58	7.53% $ 1,332,898.73
L2-4	**EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS**															
L2-4.1	Excavación y relleno para cañerías DN menor a 160mm	m3	4,840.00		0.34% $ 65,192.35	7.19% $ 1,369,472.03	6.85% $ 1,304,240.34	7.88% $ 1,499,896.06	7.19% $ 1,369,472.03	7.53% $ 1,434,664.37	7.53% $ 1,434,664.37	7.19% $ 1,369,472.03	7.88% $ 1,499,896.06	7.53% $ 1,434,664.37	7.19% $ 1,369,472.03	7.53% $ 1,434,664.37
L2-4.2	Excavación y relleno para cañerías DN mayor o igual a 160mm	m3	1,600.00		0.34% $ 27,294.37	7.19% $ 574,129.84	6.85% $ 546,785.57	7.88% $ 628,818.38	7.19% $ 574,129.84	7.53% $ 601,474.11	7.53% $ 601,474.11	7.19% $ 574,129.84	7.88% $ 628,818.38	7.53% $ 601,474.11	7.19% $ 574,129.84	7.53% $ 601,474.11
L2-5	**EMPALMES**															
L2-5.1	Empalmes	unidad	40.00		0.33% $ 18,959.69	7.13% $ 415,654.72	6.80% $ 396,695.03	7.80% $ 455,032.53	7.13% $ 415,654.72	7.48% $ 436,072.84	7.48% $ 436,072.84	7.13% $ 415,654.72	7.80% $ 455,032.53	7.48% $ 436,072.84	7.13% $ 415,654.72	7.48% $ 436,072.84
L2-5.2	Desempalmes	unidad	23.00		0.30% $ 5,372.73	7.13% $ 125,875.33	6.78% $ 119,735.07	7.78% $ 137,388.32	7.13% $ 125,875.33	7.48% $ 132,015.59	7.48% $ 132,015.59	7.13% $ 125,875.33	7.78% $ 137,388.32	7.48% $ 132,015.59	7.13% $ 125,875.33	7.48% $ 132,015.59
L2-6	**CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA**															
L2-6.1	Conexiones cortas	unidad	846.00		0.34% $ 70,218.80	7.14% $ 1,478,264.72	6.80% $ 1,408,045.92	7.82% $ 1,619,191.65	7.14% $ 1,478,264.72	7.48% $ 1,548,728.18	7.48% $ 1,548,728.18	7.14% $ 1,478,264.72	7.82% $ 1,619,191.65	7.48% $ 1,548,728.18	7.14% $ 1,478,264.72	7.48% $ 1,548,728.18
L2-7	**LEVANTAMIENTO Y REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS**															
L2-7.1	Levantamiento y reparación de veredas	m2	3,910.00		0.34% $ 84,278.67	7.14% $ 1,771,056.91	6.80% $ 1,686,714.83	7.82% $ 1,939,741.08	7.14% $ 1,771,056.91	7.48% $ 1,855,399.00	7.48% $ 1,855,399.00	7.14% $ 1,771,056.91	7.82% $ 1,939,741.08	7.48% $ 1,855,399.00	7.14% $ 1,771,056.91	7.48% $ 1,855,399.00
L2-7.2	Levantamiento y reparación de pavimentos	m2	870.00		0.34% $ 31,568.30	7.14% $ 664,967.60	6.80% $ 633,292.28	7.82% $ 728,318.23	7.14% $ 664,967.60	7.48% $ 696,642.91	7.48% $ 696,642.91	7.14% $ 664,967.60	7.82% $ 728,318.23	7.48% $ 696,642.91	7.14% $ 664,967.60	7.48% $ 696,642.91
L2-8	**VÁLVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASOCIADAS**															
L2-8.1	Hidrantes	unidad	3.00		0.33% $ 1,525.72	7.00% $ 32,040.18	6.67% $ 30,514.46	7.67% $ 35,091.62	7.00% $ 32,040.18	7.33% $ 33,565.90	7.33% $ 33,565.90	7.00% $ 32,040.18	7.67% $ 35,091.62	7.33% $ 33,565.90	7.00% $ 32,040.18	7.33% $ 33,565.90
L2-8.2	Válvula esclusa DN 90	unidad	30.00		0.33% $ 11,610.97	7.13% $ 248,474.82	6.80% $ 236,863.85	7.80% $ 271,696.77	7.13% $ 248,474.82	7.47% $ 260,085.80	7.47% $ 260,085.80	7.13% $ 248,474.82	7.80% $ 271,696.77	7.47% $ 260,085.80	7.13% $ 248,474.82	7.47% $ 260,085.80
L2-8.3	Válvula esclusa DN 200	unidad	3.00		0.33% $ 3,332.16	7.00% $ 69,975.43	6.67% $ 66,643.27	7.67% $ 76,639.76	7.00% $ 69,975.43	7.33% $ 73,307.59	7.33% $ 73,307.59	7.00% $ 69,975.43	7.67% $ 76,639.76	7.33% $ 73,307.59	7.00% $ 69,975.43	7.33% $ 73,307.59
L2-8.4	Válvula esclusa DN 250	unidad	2.00		0.00% $ 0.00	7.00% $ 66,499.35	6.50% $ 61,749.39	7.50% $ 71,249.30	7.00% $ 66,499.35	7.50% $ 71,249.30	7.50% $ 71,249.30	7.00% $ 66,499.35	7.50% $ 71,249.30	7.50% $ 71,249.30	7.00% $ 66,499.35	7.50% $ 71,249.30
L2-9	HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA	global	1.00	6.00% $ 481,315.00	6.00% $ 481,315.00	6.00% $ 481,315.00	5.00% $ 401,095.83	6.00% $ 481,315.00	6.00% $ 481,315.00	6.00% $ 481,315.00	6.00% $ 481,315.00	6.00% $ 481,315.00	6.00% $ 481,315.00	6.00% $ 481,315.00	6.00% $ 481,315.00	6.00% $ 481,315.00
				3.60% 3.60%	3.90% 7.50%	6.63% 14.13%	6.28% 20.41%	7.23% 27.64%	6.63% 34.27%	6.93% 41.21%	6.93% 48.14%	6.63% 54.77%	7.23% 62.00%	6.93% 68.94%	6.63% 75.57%	6.93% 82.50%
				$ 6,208,205.89 $ 6,208,205.89	$ 6,719,593.08 $ 12,927,798.97	$ 11,433,720.97 $ 24,361,519.94	$ 10,819,431.08 $ 35,180,951.02	$ 12,464,784.10 $ 47,645,735.12	$ 11,433,720.97 $ 59,079,456.09	$ 11,952,720.81 $ 71,032,176.90	$ 11,952,720.81 $ 82,984,897.71	$ 11,433,720.97 $ 94,418,618.68	$ 12,464,784.10 $ 106,883,402.78	$ 11,952,720.81 $ 118,836,123.59	$ 11,433,720.97 $ 130,269,844.56	$ 11,952,720.81 $ 142,222,565.37

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 3656 - LEY 5140

ECOSUR BAHIA S.A.
Lic. DIEGO PABLO HOGUILIANSKY
PRESIDENTE

FOLIO Nº 101

IF-2024-08929893-GDEBA-DPAYCMIYSPGP

14	15	16
6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	11.00% $ 184,080.67
7.53% $ 2,310,920.50	7.53% $ 2,310,920.50	3.08% $ 945,662.41
7.53% $ 583,973.33	7.53% $ 583,973.33	3.09% $ 239,810.69
7.53% $ 1,332,898.73	7.53% $ 1,332,898.73	3.09% $ 546,213.62
7.53% $ 1,434,664.37	7.53% $ 1,434,664.37	3.08% $ 587,203.25
7.53% $ 601,474.11	7.53% $ 601,474.11	3.09% $ 246,647.28
7.48% $ 436,072.84	7.48% $ 436,072.84	3.93% $ 228,974.70
7.48% $ 132,015.59	7.48% $ 132,015.59	3.96% $ 69,845.45
7.48% $ 1,548,728.18	7.48% $ 1,548,728.18	3.75% $ 776,566.10
7.48% $ 1,855,399.00	7.48% $ 1,855,399.00	3.74% $ 928,206.80
7.48% $ 696,642.91	7.48% $ 696,642.91	3.75% $ 348,749.50
7.33% $ 33,565.90	7.33% $ 33,565.90	5.67% $ 25,937.30
7.47% $ 260,085.80	7.47% $ 260,085.80	3.93% $ 137,009.46
7.33% $ 73,307.59	7.33% $ 73,307.59	5.67% $ 56,646.78
7.50% $ 71,249.30	7.50% $ 71,249.30	5.50% $ 52,249.49
6.00% $ 481,315.00	6.00% $ 481,315.00	11.00% $ 882,410.85
6.93% **89.44%** **$ 11,952,720.81** **$ 154,175,286.18**	**6.93%** **96.37%** **$ 11,952,720.81** **$ 166,128,006.99**	**3.63%** **100.00%** **$ 6,256,214.35** **$ 172,384,221.34**

IF-2024-08929893-GDEBA-DPAYCMIYSPGP

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 38561 - LEY 5140

ECOSUR BAHIA S.A.
Lic. DIEGO PABLO MOGILIANSKY
PRESIDENTE

201

ECOSUR BAHIA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA coince

Licitación Pública Internacional 8/21

PLAN DE TRABAJOS VALORIZADO

Nro.	DESCRIPCIÓN	Un	Cant	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
L3	**Lote 3 – Módulo 8**												
L3-1	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	global	1.00	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	5.00% $ 83,673.05	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66
L3-2	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROYECTO EJECUTIVO	global	1.00	50.00% $ 4,345,204.87	50.00% $ 4,345,204.87								
L3-3	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS**												
L3-3.1	Cañería PEAD PE 80 PN 10 diámetro 90 mm	m	7,730.00		0.34% $ 97,350.31	7.19% $ 2,044,540.34	6.85% $ 1,947,190.03	7.88% $ 2,239,240.95	7.19% $ 2,044,540.34	7.53% $ 2,141,890.65	7.53% $ 2,141,890.65	7.19% $ 2,044,540.34	7.88% $ 2,239,240.95
L3-3.2	Cañería PEAD PE 80 PN 10 diámetro 110 mm	m2	1,150.00		0.34% $ 17,630.22	7.19% $ 370,997.16	6.85% $ 353,322.09	7.88% $ 406,347.31	7.19% $ 370,997.16	7.53% $ 388,672.24	7.53% $ 388,672.24	7.19% $ 370,997.16	7.88% $ 406,347.31
L3-4	**EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS**												
L3-4.1	Excavación y relleno para cañerías DN menor a 160mm	m3	5,190.00		0.34% $ 69,913.58	7.19% $ 1,468,499.87	6.85% $ 1,398,546.95	7.88% $ 1,608,366.37	7.19% $ 1,468,499.87	7.53% $ 1,538,413.45	7.53% $ 1,538,413.45	7.19% $ 1,468,499.87	7.88% $ 1,608,366.37
L3-5	**EMPALMES**												
L3-5.1	Empalmes	unidad	65.00		0.34% $ 32,085.63	7.14% $ 676,715.05	6.80% $ 644,629.42	7.82% $ 740,886.30	7.14% $ 676,715.05	7.48% $ 708,800.67	7.48% $ 708,800.67	7.14% $ 676,715.05	7.82% $ 740,886.30
L3-5.2	Desempalmes	unidad	37.00		0.32% $ 9,210.39	7.19% $ 204,163.64	6.84% $ 194,185.72	7.86% $ 223,351.96	7.19% $ 204,163.64	7.51% $ 213,374.04	7.51% $ 213,374.04	7.19% $ 204,163.64	7.86% $ 223,351.96
L3-6	**CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA**												
L3-6.1	Conexiones cortas	unidad	645.00		0.34% $ 53,581.59	7.14% $ 1,127,170.73	6.80% $ 1,073,344.48	7.82% $ 1,234,333.92	7.14% $ 1,127,170.73	7.48% $ 1,180,752.32	7.48% $ 1,180,752.32	7.14% $ 1,127,170.73	7.82% $ 1,234,333.92
L3-7	**LEVANTAMIENTO Y REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS**												
L3-7.1	Levantamiento y reparación de veredas	m2	3,200.00		0.34% $ 69,249.29	7.17% $ 1,454,425.32	6.83% $ 1,385,176.03	7.85% $ 1,592,923.90	7.17% $ 1,454,425.32	7.51% $ 1,523,674.61	7.51% $ 1,523,674.61	7.17% $ 1,454,425.32	7.85% $ 1,592,923.90
L3-7.2	Levantamiento y reparación de pavimentos	m2	720.00		0.34% $ 26,110.73	7.14% $ 550,251.59	6.80% $ 524,033.85	7.82% $ 602,687.08	7.14% $ 550,251.59	7.48% $ 576,469.33	7.48% $ 576,469.33	7.14% $ 550,251.59	7.82% $ 602,687.08
L3-8	**VÁLVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASOCIADAS**												
L3-8.1	Hidrantes	unidad	5.00		0.20% $ 1,525.72	7.00% $ 53,400.30	6.80% $ 51,874.58	7.80% $ 59,503.19	7.00% $ 53,400.30	7.40% $ 56,451.74	7.40% $ 56,451.74	7.00% $ 53,400.30	7.80% $ 59,503.19
L3-8.2	Válvula esclusa DN 90	unidad	39.00		0.33% $ 15,094.26	7.13% $ 322,785.05	6.79% $ 307,690.78	7.82% $ 354,134.68	7.13% $ 322,785.05	7.46% $ 337,879.31	7.46% $ 337,879.31	7.13% $ 322,785.05	7.82% $ 354,134.68
L3-8.3	Válvula esclusa DN 110	unidad	1.00		0.00% $ 0.00	7.00% $ 9,739.79	6.00% $ 8,348.39	7.00% $ 9,739.79	7.00% $ 9,739.79	7.00% $ 9,739.79	7.00% $ 9,739.79	7.00% $ 9,739.79	7.00% $ 9,739.79
L3-9	HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA	global	1.00	6.00% $ 394,410.90	6.00% $ 394,410.90	6.00% $ 394,410.90	5.00% $ 328,675.75	6.00% $ 394,410.90	6.00% $ 394,410.90	6.00% $ 394,410.90	6.00% $ 394,410.90	6.00% $ 394,410.90	6.00% $ 394,410.90
				3.65%	**3.95%**	**6.63%**	**6.27%**	**7.22%**	**6.63%**	**6.92%**	**6.92%**	**6.63%**	**7.22%**
				3.65%	**7.60%**	**14.23%**	**20.49%**	**27.72%**	**34.34%**	**41.26%**	**48.19%**	**54.81%**	**62.03%**
				$ 4,840,023.43	**$ 5,231,775.15**	**$ 8,777,507.40**	**$ 8,300,691.12**	**$ 9,566,334.01**	**$ 8,777,507.40**	**$ 9,170,936.71**	**$ 9,170,936.71**	**$ 8,777,507.40**	**$ 9,566,334.01**
				$ 4,840,023.43	**$ 10,071,798.58**	**$ 18,849,305.98**	**$ 27,149,997.10**	**$ 36,716,331.11**	**$ 45,493,838.51**	**$ 54,664,775.22**	**$ 63,835,711.93**	**$ 72,613,219.33**	**$ 82,179,553.34**

NESTOR JULIO REPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 38630 - LE 7 5140

ECOSUR BAHIA S.A.
LIC. DIEGO PABLO MOSCOVICH
PRESIDENTE

FOLIO Nº 103

IF-2024-08929893-GDEBA-DPAYCMIYSPGP

M11	M12	M13	M14	M15	M16
6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	11.00% $ 184,080.67
7.53% $ 2,141,890.65	7.19% $ 2,044,540.34	7.53% $ 2,141,890.65	7.53% $ 2,141,890.65	7.53% $ 2,141,890.65	3.08% $ 876,557.30
7.53% $ 388,672.24	7.19% $ 370,997.16	7.53% $ 388,672.24	7.53% $ 388,672.24	7.53% $ 388,672.24	3.09% $ 159,299.99
7.53% $ 1,538,413.45	7.19% $ 1,468,499.87	7.53% $ 1,538,413.45	7.53% $ 1,538,413.45	7.53% $ 1,538,413.45	3.08% $ 629,654.95
7.48% $ 708,800.67	7.14% $ 676,715.05	7.48% $ 708,800.67	7.48% $ 708,800.67	7.48% $ 708,800.67	3.82% $ 361,692.53
7.51% $ 213,374.04	7.19% $ 204,163.64	7.51% $ 213,374.04	7.51% $ 213,374.04	7.51% $ 213,374.04	3.27% $ 92,871.42
7.48% $ 1,180,752.32	7.14% $ 1,127,170.73	7.48% $ 1,180,752.32	7.48% $ 1,180,752.32	7.48% $ 1,180,752.32	3.75% $ 592,088.85
7.51% $ 1,523,674.61	7.17% $ 1,454,425.32	7.51% $ 1,523,674.61	7.51% $ 1,523,674.61	7.51% $ 1,523,674.61	3.41% $ 692,809.94
7.48% $ 576,469.33	7.14% $ 550,251.59	7.48% $ 576,469.33	7.48% $ 576,469.33	7.48% $ 576,469.33	3.76% $ 289,465.32
7.40% $ 56,451.74	7.00% $ 53,400.30	7.40% $ 56,451.74	7.40% $ 56,451.74	7.40% $ 56,451.74	5.00% $ 38,143.08
7.46% $ 337,879.31	7.13% $ 322,785.05	7.46% $ 337,879.31	7.46% $ 337,879.31	7.46% $ 337,879.31	3.95% $ 178,809.01
7.00% $ 9,739.79	7.00% $ 9,739.79	7.00% $ 9,739.79	7.00% $ 9,739.79	7.00% $ 9,739.79	10.00% $ 13,913.93
6.00% $ 394,410.90	6.00% $ 394,410.90	6.00% $ 394,410.90	6.00% $ 394,410.90	6.00% $ 394,410.90	11.00% $ 723,086.71
6.92% **68.96%** **$ 9,170,936.71** **$ 91,350,490.05**	**6.63%** **75.58%** **$ 8,777,507.40** **$ 100,127,997.45**	**6.92%** **82.51%** **$ 9,170,936.71** **$ 109,298,934.16**	**6.92%** **89.43%** **$ 9,170,936.71** **$ 118,469,870.87**	**6.92%** **96.35%** **$ 9,170,936.71** **$ 127,640,807.58**	**3.65%** **100.00%** **$ 4,832,473.70** **$ 132,473,281.28**

IF-2024-08929893-GDEBA-DPAYCMIYSPGP

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 36587 - LEY 5140

ECOSUR BAHIA S.A.
LIC. DIEGO PABLO MOGUILIANSKY
PRESIDENTE

FOLIO Nº 104

ECOSUR BAHIA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA — coince

Licitación Pública Internacional 8/21

PLAN DE TRABAJOS VALORIZADO

Nro.	DESCRIPCIÓN	Un	Cant	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
L4	Lote 4 – Módulo 9												
L4-1	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	global	1.00	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	5.00% $ 83,673.05	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66
L4-2	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROYECTO EJECUTIVO	global	1.00	50.00% $ 4,957,990.17	50.00% $ 4,957,990.17								
L4-3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS												
L4-3.1	Cañería PEAD PE 80 PN 10 diámetro 90 mm	m	9,100.00		0.34% $ 114,599.00	7.19% $ 2,406,910.03	6.85% $ 2,292,274.25	7.88% $ 2,636,144.81	7.19% $ 2,406,910.03	7.53% $ 2,521,509.03	7.53% $ 2,521,509.03	7.19% $ 2,406,910.03	7.88% $ 2,636,144.81
L4-3.2	Cañería PEAD PE 80 PN 10 diámetro 110 mm	m	360.00		0.34% $ 5,517.85	7.19% $ 116,144.09	6.85% $ 110,581.38	7.88% $ 127,179.80	7.19% $ 116,144.09	7.53% $ 121,661.95	7.53% $ 121,661.95	7.19% $ 116,144.09	7.88% $ 127,179.80
L4-3.3	Cañería PEAD PE 80 PN 10 diámetro 160 mm	m	800.00		0.40% $ 26,957.12	8.40% $ 566,099.52	8.00% $ 539,142.40	9.20% $ 620,013.76	8.40% $ 566,099.52	8.80% $ 593,056.64	8.80% $ 593,056.64	8.40% $ 566,099.52	9.20% $ 620,013.76
L4-4	EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS												
L4-4.1	Excavación y relleno para cañerías DN menor a 160mm	m3	5,530.00		0.34% $ 74,477.43	7.19% $ 1,564,694.97	6.85% $ 1,490,178.19	7.88% $ 1,713,728.53	7.19% $ 1,564,694.97	7.53% $ 1,639,211.75	7.53% $ 1,639,211.75	7.19% $ 1,564,694.97	7.88% $ 1,713,728.53
L4-4.2	Excavación y relleno para cañerías DN mayor o igual a 160mm	m3	610.00		0.34% $ 10,378.85	7.19% $ 218,853.94	6.85% $ 208,475.10	7.88% $ 239,711.43	7.19% $ 218,853.94	7.53% $ 229,282.69	7.53% $ 229,282.69	7.19% $ 218,853.94	7.88% $ 239,711.43
L4-5	EMPALMES												
L4-5.1	Empalmes	unidad	56.00		0.34% $ 44,336.51	7.18% $ 938,067.12	6.84% $ 893,730.61	7.88% $ 1,029,073.63	7.18% $ 938,067.12	7.52% $ 982,403.63	7.52% $ 982,403.63	7.18% $ 938,067.12	7.88% $ 1,029,073.63
L4-5.2	Desempalmes	unidad	39.00		0.33% $ 9,977.92	7.15% $ 214,141.57	6.82% $ 204,163.64	7.85% $ 234,864.94	7.15% $ 214,141.57	7.49% $ 224,119.49	7.49% $ 224,119.49	7.15% $ 214,141.57	7.85% $ 234,864.94
L4-6	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA												
L4-6.1	Conexiones cortas	unidad	855.00		0.34% $ 70,952.79	7.14% $ 1,494,167.93	6.80% $ 1,422,970.48	7.82% $ 1,636,318.18	7.14% $ 1,494,167.93	7.48% $ 1,565,120.73	7.48% $ 1,565,120.73	7.14% $ 1,494,167.93	7.82% $ 1,636,318.18
L4-7	LEVANTAMIENTO Y REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS												
L4-7.1	Levantamiento y reparación de veredas	m2	3,770.00		0.34% $ 81,298.16	7.14% $ 1,707,641.81	6.80% $ 1,626,343.65	7.82% $ 1,870,301.54	7.14% $ 1,707,641.81	7.48% $ 1,788,939.97	7.48% $ 1,788,939.97	7.14% $ 1,707,641.81	7.82% $ 1,870,301.54
L4-7.2	Levantamiento y reparación de pavimentos	m2	840.00		0.34% $ 30,498.19	7.14% $ 641,960.19	6.80% $ 611,462.00	7.82% $ 703,170.60	7.14% $ 641,960.19	7.48% $ 672,565.39	7.48% $ 672,565.39	7.14% $ 641,960.19	7.82% $ 703,170.60
L4-8	VÁLVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASOCIADAS												
L4-8.1	Hidrantes	unidad	3.00		0.33% $ 1,525.72	7.00% $ 32,040.18	6.67% $ 30,514.46	7.67% $ 35,091.62	7.00% $ 32,040.18	7.33% $ 33,565.90	7.33% $ 33,565.90	7.00% $ 32,040.18	7.67% $ 35,091.62
L4-8.2	Válvula esclusa DN 90	unidad	40.00		0.33% $ 15,094.26	7.13% $ 330,912.73	6.80% $ 315,818.47	7.80% $ 362,262.36	7.13% $ 330,912.73	7.48% $ 347,168.09	7.48% $ 347,168.09	7.13% $ 330,912.73	7.80% $ 362,262.36
L4-9	HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA	global	1.00	6.00% $ 438,531.45	6.00% $ 438,531.45	6.00% $ 438,531.45	5.00% $ 365,442.87	6.00% $ 438,531.45	6.00% $ 438,531.45	6.00% $ 438,531.45	6.00% $ 438,531.45	6.00% $ 438,531.45	6.00% $ 438,531.45
				3.42%	3.73%	6.71%	6.35%	7.32%	6.71%	7.01%	7.01%	6.71%	7.32%
				3.42%	7.15%	13.86%	20.21%	27.53%	34.24%	41.26%	48.27%	54.98%	62.30%
				$ 5,496,929.28	$ 5,982,543.08	$ 10,770,573.19	$ 10,194,770.55	$ 11,746,800.31	$ 10,770,573.19	$ 11,257,544.37	$ 11,257,544.37	$ 10,770,573.19	$ 11,746,800.31
				$ 5,496,929.28	$ 11,479,472.36	$ 22,250,045.55	$ 32,444,816.10	$ 44,191,616.41	$ 54,962,189.60	$ 66,219,733.97	$ 77,477,278.34	$ 88,247,851.53	$ 99,994,651.84

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 36861 / LEY 5140

ECOSUR BAHIA S.A.
Lic. DIEGO PABLO MOGILIANSKY
PRESIDENTE

FOLIO Nº 105

IF-2024-08929893-GDEBA-DPAYCMIYSPGP

M11	M12	M13	M14	M15	M16
6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	6.00% $ 100,407.66	11.00% $ 184,080.67
7.53% $ 2,521,509.03	7.19% $ 2,406,910.03	7.53% $ 2,521,509.03	7.53% $ 2,521,509.03	7.53% $ 2,521,509.03	3.08% $ 1,031,758.83
7.53% $ 121,661.95	7.19% $ 116,144.09	7.53% $ 121,661.95	7.53% $ 121,661.95	7.53% $ 121,661.95	3.09% $ 49,974.71
8.80% $ 593,056.64	8.40% $ 566,099.52	8.80% $ 593,056.64	4.40% $ 296,528.32		
7.53% $ 1,639,211.75	7.19% $ 1,564,694.97	7.53% $ 1,639,211.75	7.53% $ 1,639,211.75	7.53% $ 1,639,211.75	3.08% $ 670,847.74
7.53% $ 229,282.69	7.19% $ 218,853.94	7.53% $ 229,282.69	7.53% $ 229,282.69	7.53% $ 229,282.69	3.10% $ 94,407.59
7.52% $ 982,403.63	7.18% $ 938,067.12	7.52% $ 982,403.63	7.52% $ 982,403.63	7.52% $ 982,403.63	3.25% $ 424,697.04
7.49% $ 224,119.49	7.15% $ 214,141.57	7.49% $ 224,119.49	7.49% $ 224,119.49	7.49% $ 224,119.49	3.62% $ 108,222.09
7.48% $ 1,565,120.73	7.14% $ 1,494,167.93	7.48% $ 1,565,120.73	7.48% $ 1,565,120.73	7.48% $ 1,565,120.73	3.75% $ 784,884.67
7.48% $ 1,788,939.97	7.14% $ 1,707,641.81	7.48% $ 1,788,939.97	7.48% $ 1,788,939.97	7.48% $ 1,788,939.97	3.74% $ 895,040.75
7.48% $ 672,565.39	7.14% $ 641,960.19	7.48% $ 672,565.39	7.48% $ 672,565.39	7.48% $ 672,565.39	3.75% $ 337,406.31
7.33% $ 33,565.90	7.00% $ 32,040.18	7.33% $ 33,565.90	7.33% $ 33,565.90	7.33% $ 33,565.90	5.67% $ 25,937.30
7.48% $ 347,168.09	7.13% $ 330,912.73	7.48% $ 347,168.09	7.48% $ 347,168.09	7.48% $ 347,168.09	3.93% $ 182,292.29
6.00% $ 438,531.45	6.00% $ 438,531.45	6.00% $ 438,531.45	6.00% $ 438,531.45	6.00% $ 438,531.45	11.00% $ 803,974.25
7.01% **69.32%** **$ 11,257,544.37** **$ 111,252,196.21**	**6.71%** **76.03%** **$ 10,770,573.19** **$ 122,022,769.40**	**7.01%** **83.04%** **$ 11,257,544.37** **$ 133,280,313.77**	**6.83%** **89.87%** **$ 10,961,016.05** **$ 144,241,329.82**	**6.64%** **96.51%** **$ 10,664,487.73** **$ 154,905,817.55**	**3.49%** **100.00%** **$ 5,593,524.24** **$ 160,499,341.79**

IF-2024-08929893-GDEBA-DPAYCMIYSPGP

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 36801 - LEY 5140

EROSUR BAHIA S.A.
Lic. DIEGO PABLO MOGILIANSKY
PRESIDENTE

FOLIO Nº 106

ECOSUR BAHIA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

coince

Licitación Pública Internacional 8/21

PLAN DE TRABAJOS VALORIZADO

Nro.	DESCRIPCIÓN	Un	Cant	1	2	3	4	5	6	7	8	9
L5	**Lote 5 – Módulo 10**											
L5-1	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	global	1.00	8.00% $ 113,911.22	8.00% $ 113,911.22	8.00% $ 113,911.22	7.00% $ 99,672.31	8.00% $ 113,911.22	8.00% $ 113,911.22	8.00% $ 113,911.22	8.00% $ 113,911.22	8.00% $ 113,911.22
L5-2	HONORARIOS PROFESIONALES POR PROYECTO EJECUTIVO	global	1.00	50.00% $ 3,119,634.26	50.00% $ 3,119,634.27							
L5-3	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS**											
L5-3.1	Cañería PEAD PE 80 PN 10 diámetro 90 mm	m	6,900.00		1.44% $ 365,973.90	10.10% $ 2,562,037.95	9.62% $ 2,440,046.65	11.06% $ 2,806,057.32	10.10% $ 2,562,037.95	10.58% $ 2,684,029.25	10.58% $ 2,684,029.25	10.10% $ 2,562,037.95
L5-4	**EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS**											
L5-4.1	Excavación y relleno para cañerías DN menor a 160mm	m3	4,010.00		0.49% $ 76,562.65	10.19% $ 1,608,287.68	9.71% $ 1,531,725.04	11.16% $ 1,761,452.32	10.19% $ 1,608,287.68	10.68% $ 1,684,889.67	10.68% $ 1,684,889.67	10.19% $ 1,608,287.68
L5-5	**EMPALMES**											
L5-5.1	Empalmes	unidad	17.00		0.47% $ 18,668.00	10.12% $ 401,362.05	9.65% $ 382,694.05	11.06% $ 438,698.06	10.12% $ 401,362.05	10.59% $ 420,030.05	10.59% $ 420,030.05	10.12% $ 401,362.05
L5-5.2	Desempalmes	unidad	16.00		0.44% $ 5,372.73	10.13% $ 124,340.26	9.63% $ 118,200.00	11.06% $ 135,853.25	10.13% $ 124,340.26	10.63% $ 130,480.52	10.63% $ 130,480.52	10.13% $ 124,340.26
L5-6	**CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA**											
L5-6.1	Conexiones cortas	unidad	575.00		0.48% $ 67,772.15	10.14% $ 1,427,129.78	9.66% $ 1,359,112.96	11.11% $ 1,562,918.74	10.14% $ 1,427,129.78	10.63% $ 1,495,146.59	10.63% $ 1,495,146.59	10.14% $ 1,427,129.78
L5-7	**LEVANTAMIENTO Y REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS**											
L5-7.1	Levantamiento y reparación de veredas	m2	2,490.00		0.48% $ 76,224.95	10.14% $ 1,601,865.43	9.66% $ 1,525,577.06	11.11% $ 1,754,442.16	10.14% $ 1,601,865.43	10.63% $ 1,678,153.79	10.63% $ 1,678,153.79	10.14% $ 1,601,865.43
L5-7.2	Levantamiento y reparación de pavimentos	m2	560.00		0.48% $ 28,893.02	10.14% $ 607,930.63	9.66% $ 578,930.59	11.11% $ 665,823.69	10.14% $ 607,930.63	10.63% $ 636,823.65	10.63% $ 636,823.65	10.14% $ 607,930.63
L5-8	**VÁLVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASOCIADAS**											
L5-8.1	Hidrantes	unidad	10.00		0.40% $ 6,102.89	10.10% $ 154,098.00	9.60% $ 146,469.39	11.10% $ 169,355.23	10.10% $ 154,098.00	10.60% $ 161,726.62	10.60% $ 161,726.62	10.10% $ 154,098.00
L5-8.2	Válvula esclusa DN 90	unidad	7.00		0.43% $ 3,483.29	10.14% $ 82,437.91	9.57% $ 77,793.52	11.00% $ 89,404.49	10.14% $ 82,437.91	10.57% $ 85,921.20	10.57% $ 85,921.20	10.14% $ 82,437.91
L5-9	HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA	global	1.00	8.00% $ 420,704.96	8.00% $ 420,704.96	8.00% $ 420,704.96	7.00% $ 368,116.84	8.00% $ 420,704.96	8.00% $ 420,704.96	8.00% $ 420,704.96	8.00% $ 420,704.96	8.00% $ 420,704.96
				3.75%	**4.42%**	**9.34%**	**8.85%**	**10.18%**	**9.34%**	**9.76%**	**9.76%**	**9.34%**
				3.75%	**8.16%**	**17.51%**	**26.36%**	**36.54%**	**45.88%**	**55.64%**	**65.40%**	**74.74%**
				$ 3,654,250.44	**$ 4,303,304.03**	**$ 9,104,105.87**	**$ 8,628,338.41**	**$ 9,918,621.44**	**$ 9,104,105.87**	**$ 9,511,817.52**	**$ 9,511,817.52**	**$ 9,104,105.87**
				$ 3,654,250.44	**$ 7,957,554.47**	**$ 17,061,660.34**	**$ 25,689,998.75**	**$ 35,608,620.19**	**$ 44,712,726.06**	**$ 54,224,543.58**	**$ 63,736,361.10**	**$ 72,840,466.97**

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 38561 - LEY 5140

ECOSUR BAHIA S.A.
Lic. DIEGO PABLO GUILLIANSKY
APODERADO

FOLIO Nº 107

IF-2024-08929893-GDEBA-DPAYCMIYSPGP

10	11	12
8.00% $ 113,911.22	8.00% $ 113,911.22	13.00% $ 185,105.69
11.06% $ 2,806,057.32	10.58% $ 2,684,029.25	4.81% $ 1,220,207.21
11.16% $ 1,761,452.32	10.68% $ 1,684,889.67	4.86% $ 766,059.22
11.06% $ 438,698.06	10.59% $ 420,030.05	5.65% $ 224,016.04
11.06% $ 135,853.25	10.63% $ 130,480.52	5.56% $ 68,310.43
11.11% $ 1,562,918.74	10.63% $ 1,495,146.59	5.32% $ 748,674.30
11.11% $ 1,754,442.16	10.63% $ 1,678,153.79	5.32% $ 839,615.91
11.11% $ 665,823.69	10.63% $ 636,823.65	5.32% $ 318,893.37
11.10% $ 169,355.23	10.60% $ 161,726.62	5.70% $ 86,966.20
11.00% $ 89,404.49	10.57% $ 85,921.20	5.86% $ 47,604.99
8.00% $ 420,704.96	8.00% $ 420,704.96	13.00% $ 683,645.61
10.18%	**9.76%**	**5.32%**
84.92%	**94.68%**	**100.00%**
$ 9,918,621.44	**$ 9,511,817.52**	**$ 5,189,098.97**
$ 82,759,088.41	**$ 92,270,905.93**	**$ 97,460,004.90**

IF-2024-08929893-GDEBA-DPAYCMIYSPGP

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 36581 - LEY 5140

ECOSUR BAHIA S.A.
Lic. DIEGO PABLO MOGUILANSKY
PRESIDENTE

FOLIO Nº 106

FOLIO Nº 109


Curva de inversión, con porcentajes especificando montos.	6

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 36561 - LEY 5140

ECOSUR BAHIA S.A.
Lic. DIEGO PABLO MOSQUILIANSKY
RESIDENTE

ECOSUR BAHIA S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA


coince

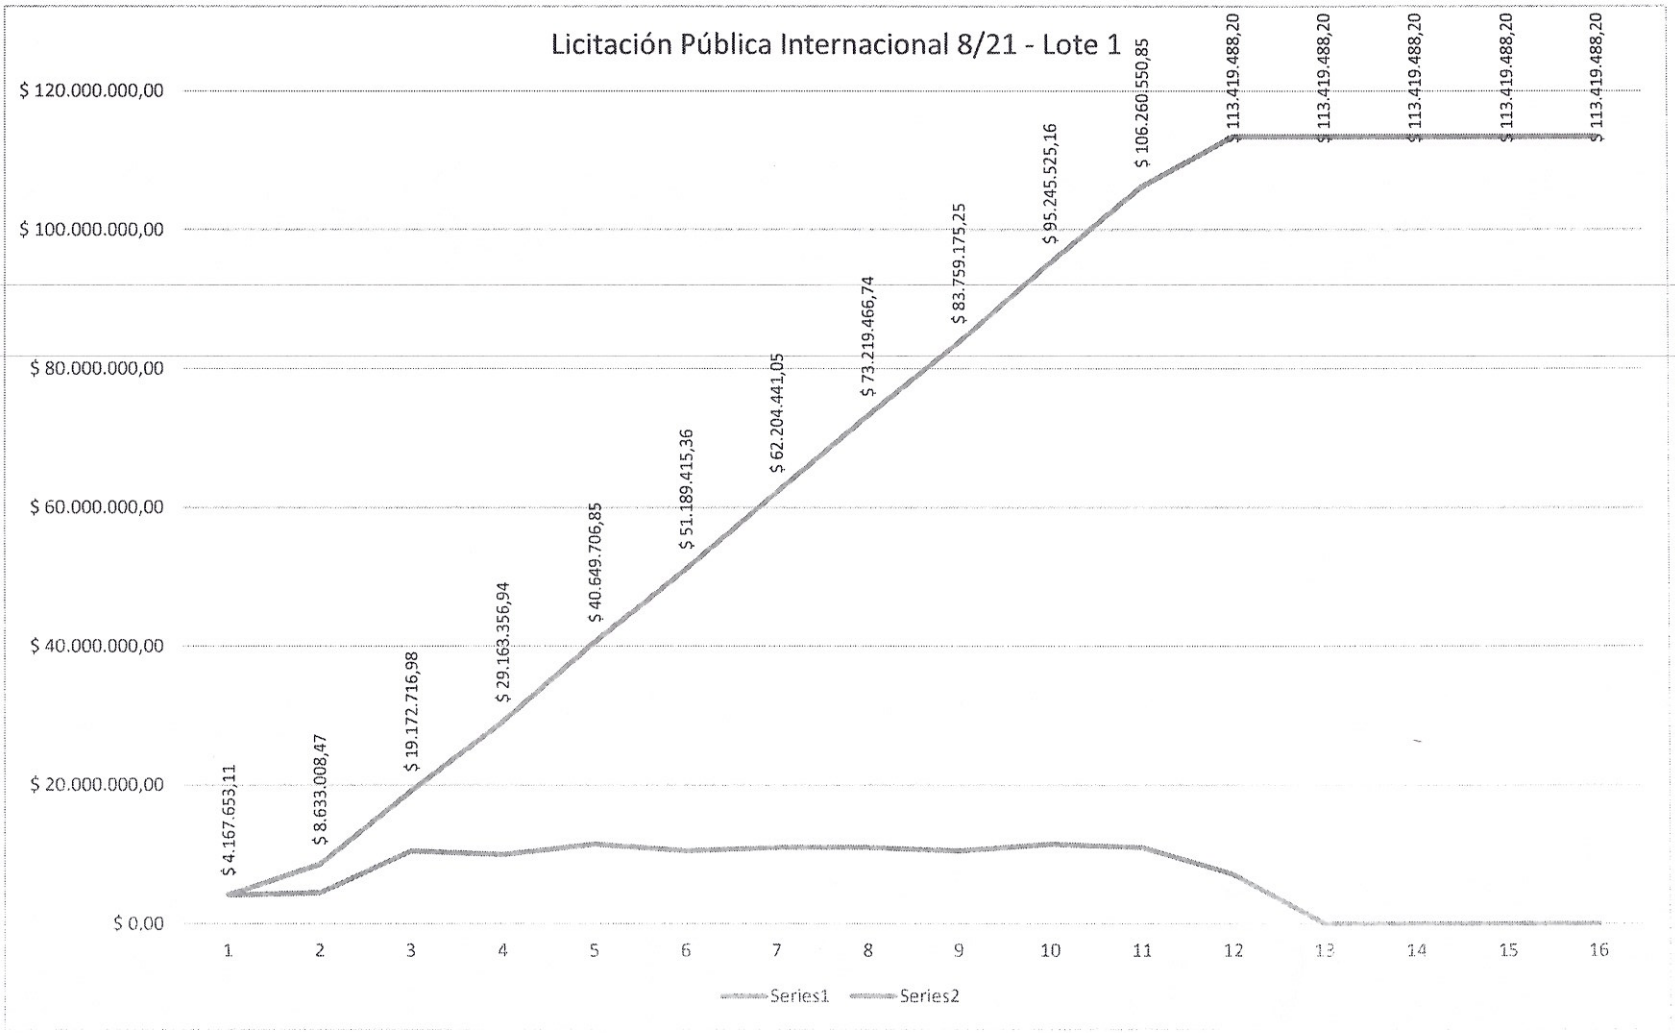

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT 38961 - LEY 5140

ECOSUR BAHIA S.A.
Lic. DIEGO PABLO MOGUILIANSKY
PRESIDENTE


FOLIO Nº 110

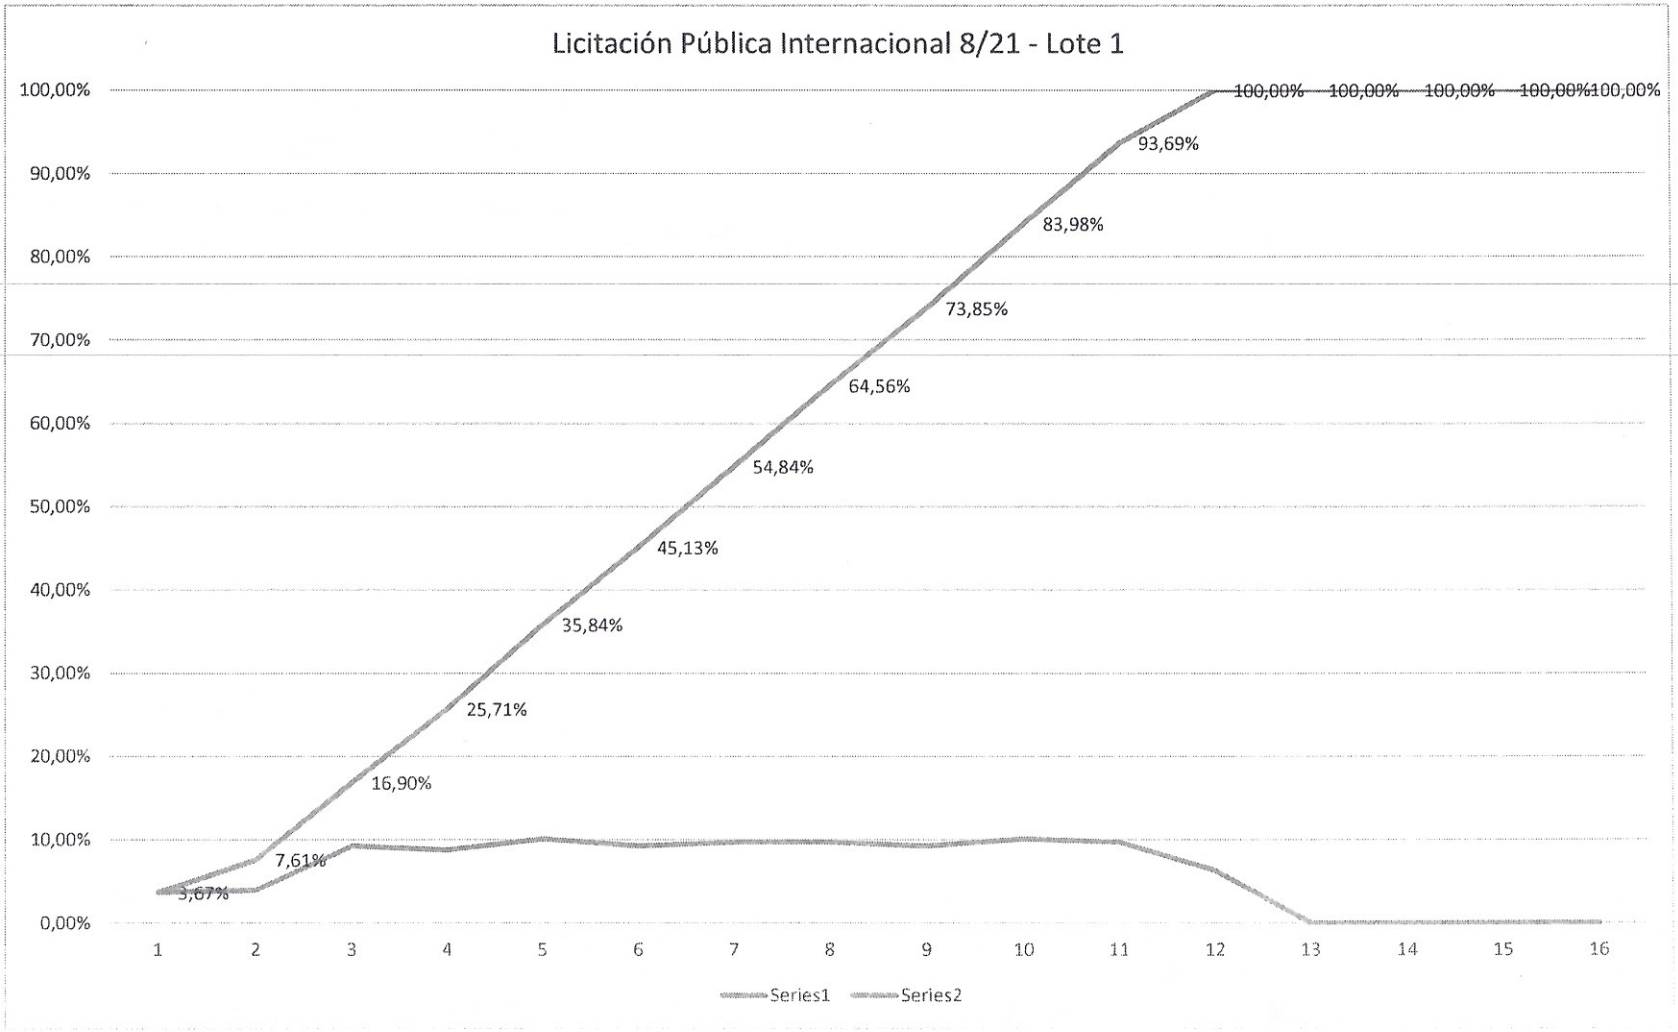

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 3656 - LEY 5140

ECOSUR BAHIA S.A.
Lic. DIEGO PABLO MOGUILIANSKY
PRESIDENTE


FOLIO Nº

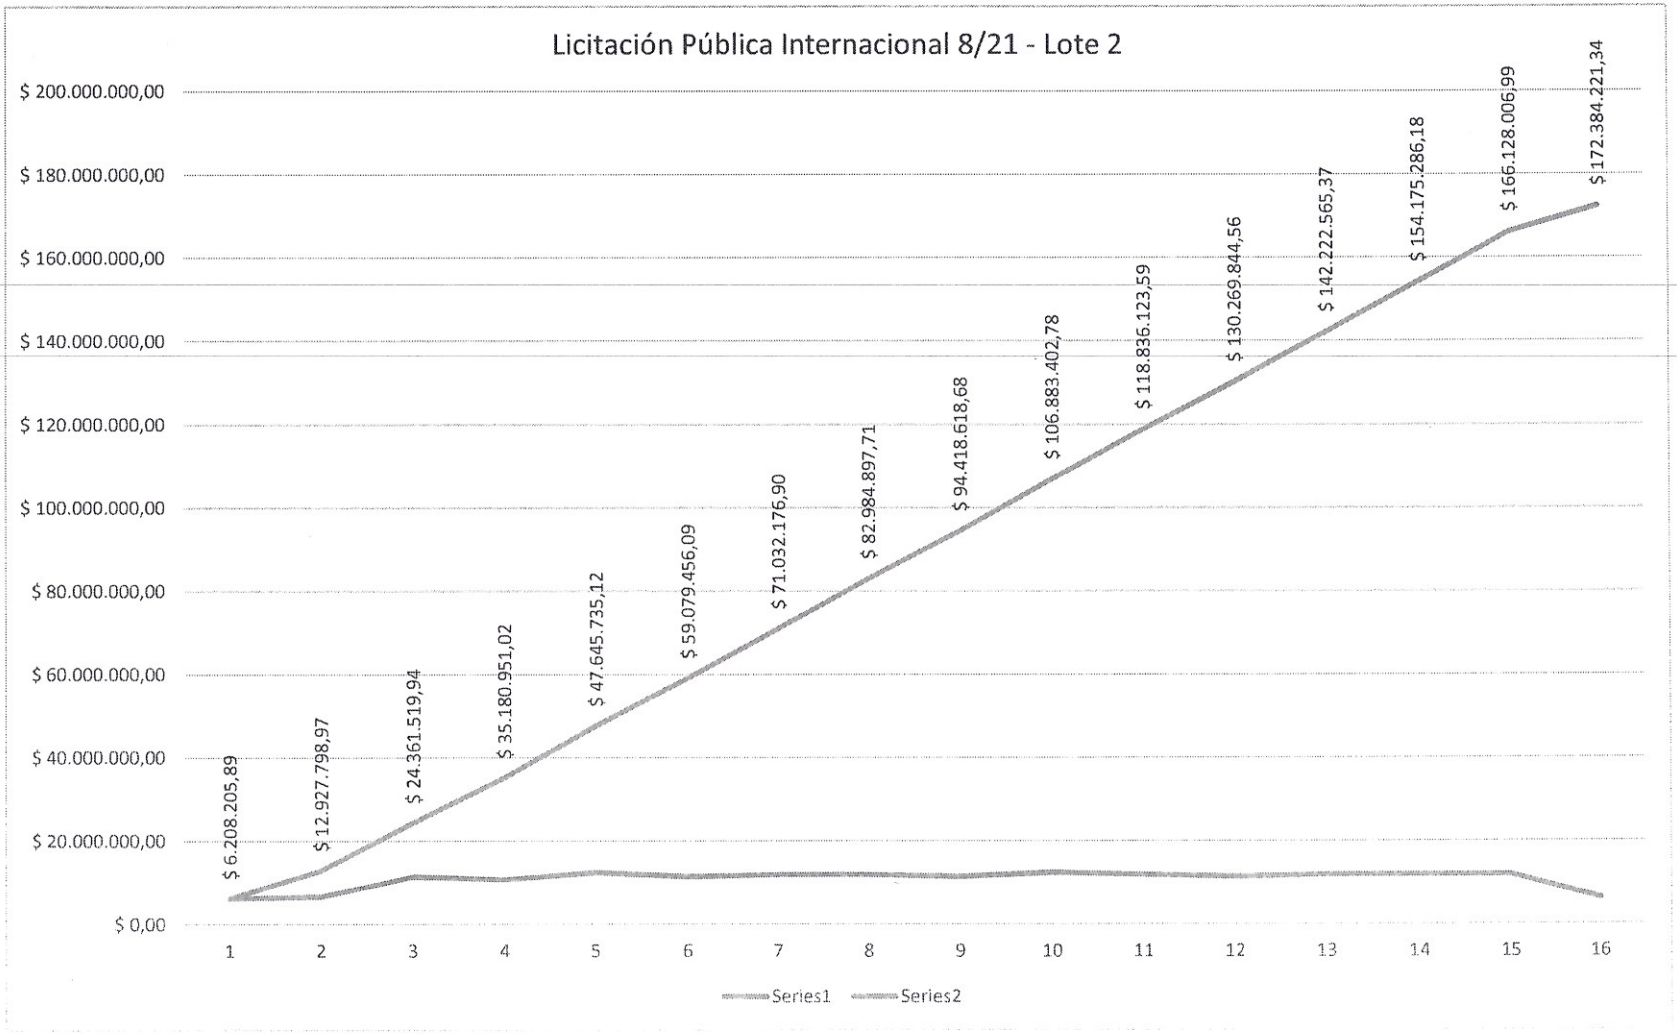

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT 36561 - LEY 5140

ECOSUR BAHIA S.A.
Lic. DIEGO PABLO MOGUILIANSKY
PRESIDENTE


FOLIO Nº 112

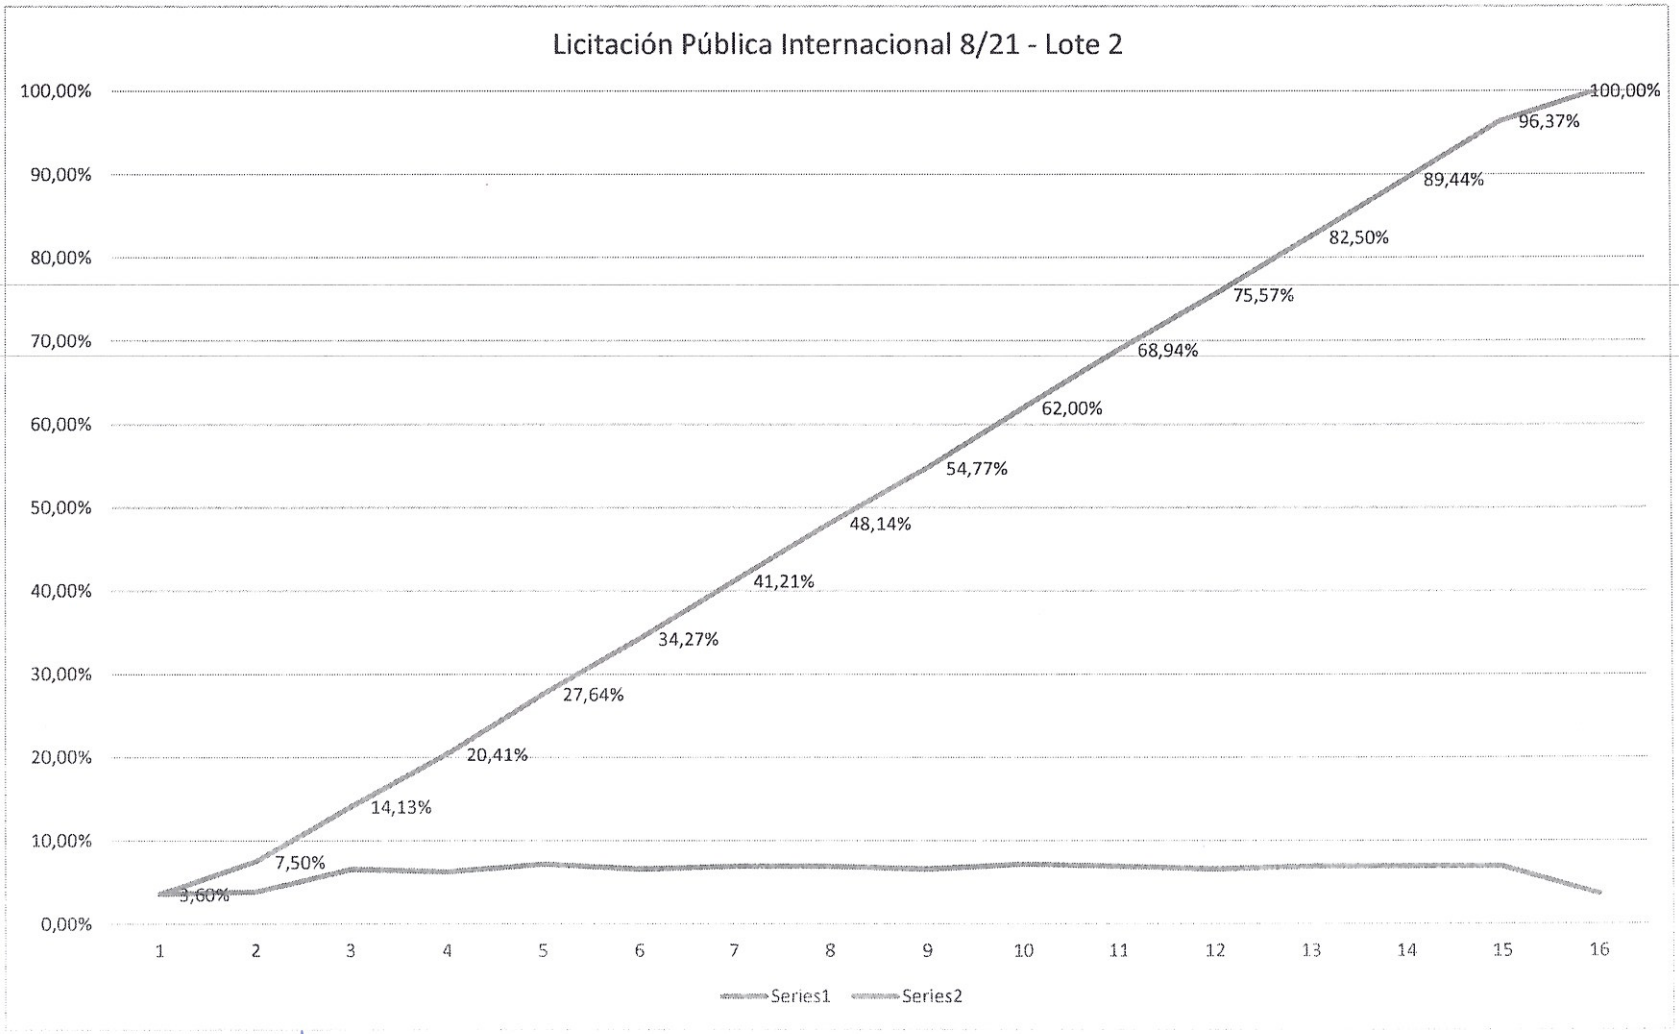

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 38561 LEY 5140

ECOSUR BAHIA S.A.
Lic. DIEGO PABLO MOGUILANSKY
PRESIDENTE


FOLIO Nº 171

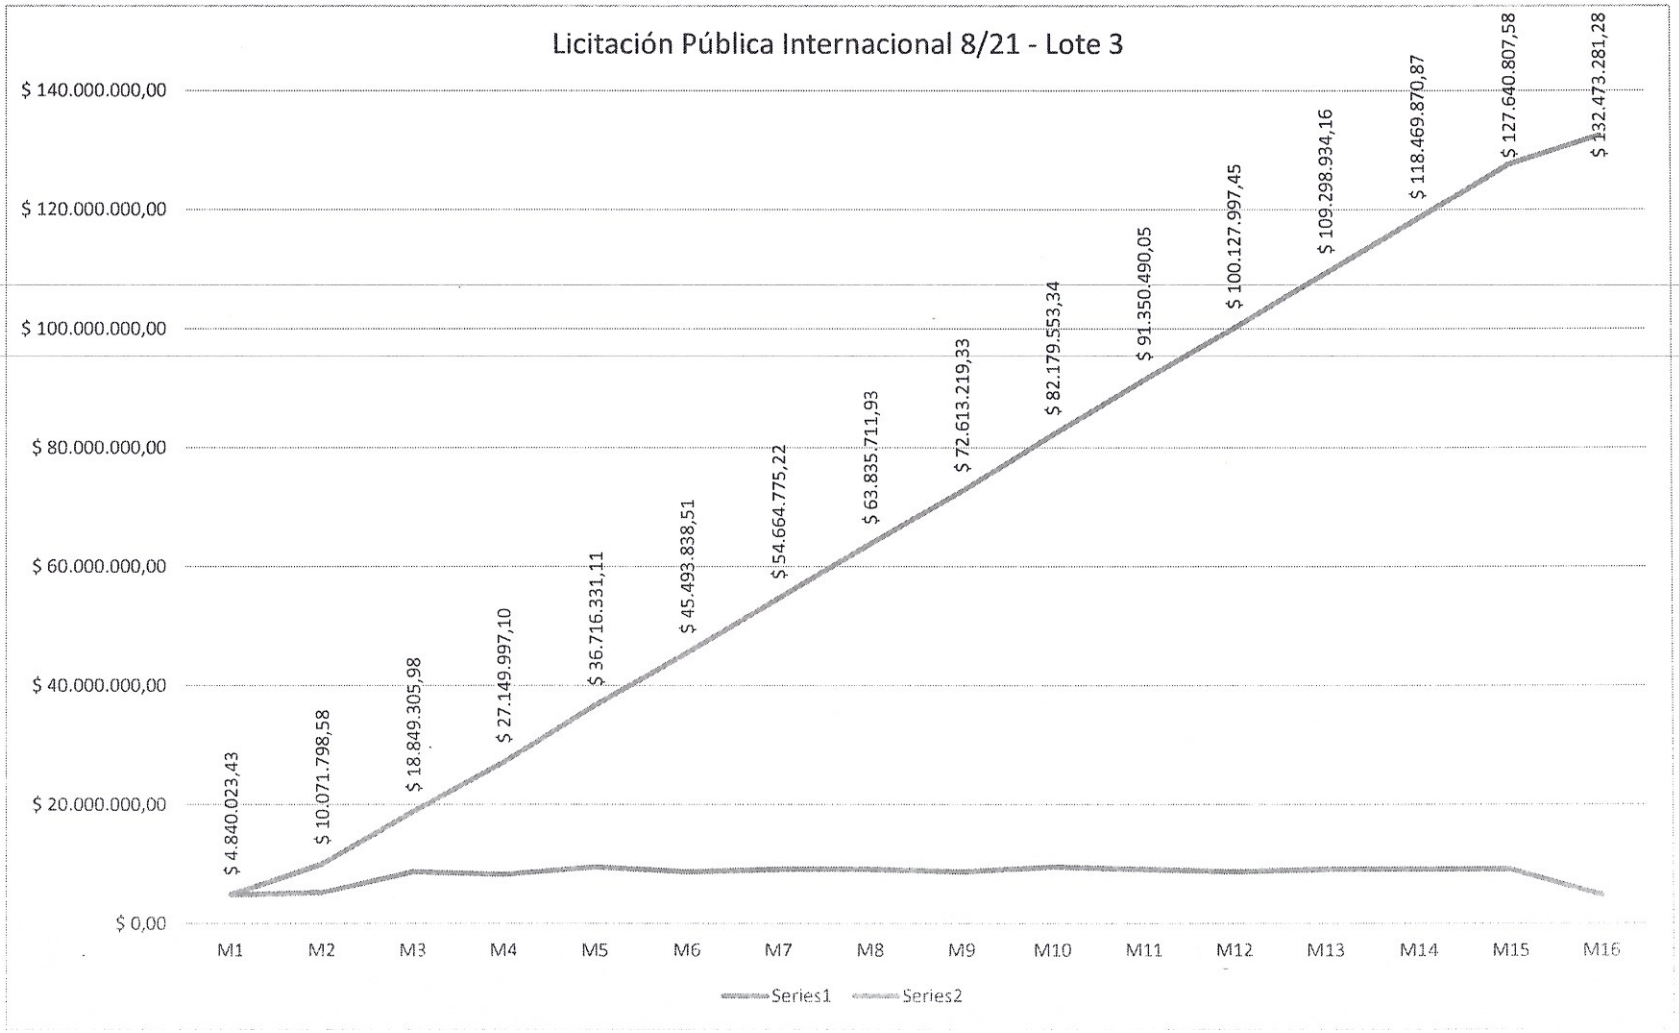

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 36567 LEY 6140

ECOSUR BAHIA S.A.
Lic. DIEGO PABLO MOGUILIANSKY
PRESIDENTE


114

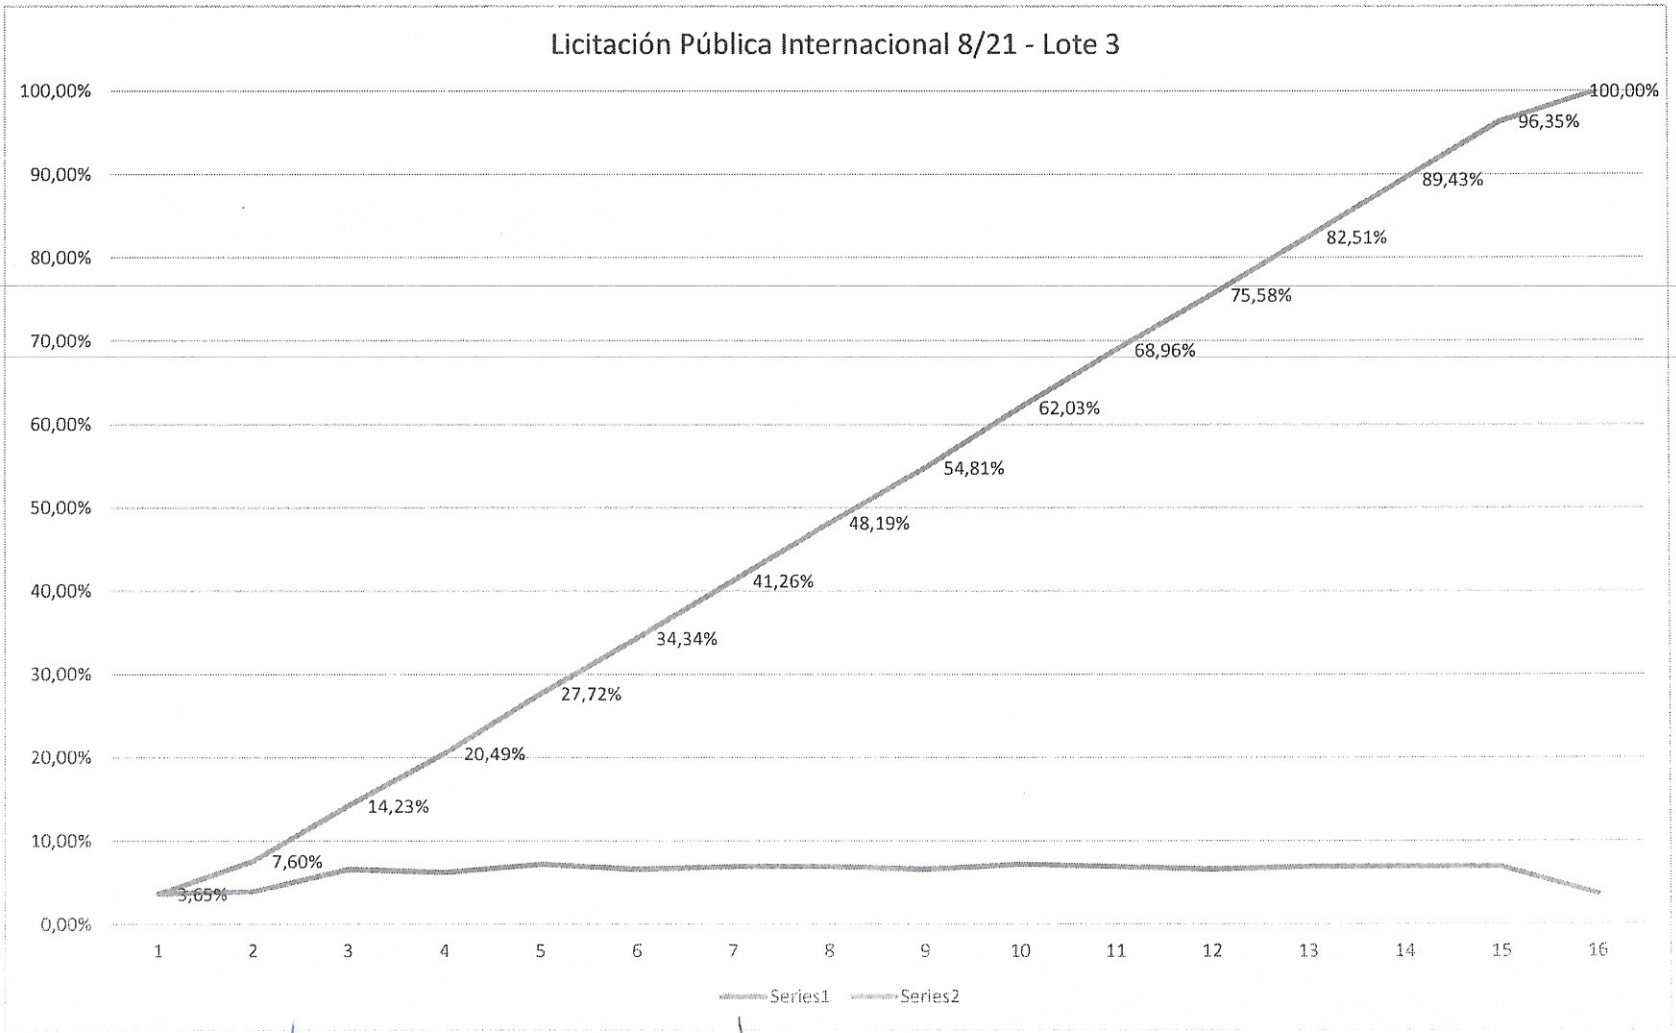

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 38561 - LEY 5140

ECOSUR BAHIA S.A.
Lic. DIEGO PABLO MOGUILIANSKY
PRESIDENTE


FOLIO Nº 115

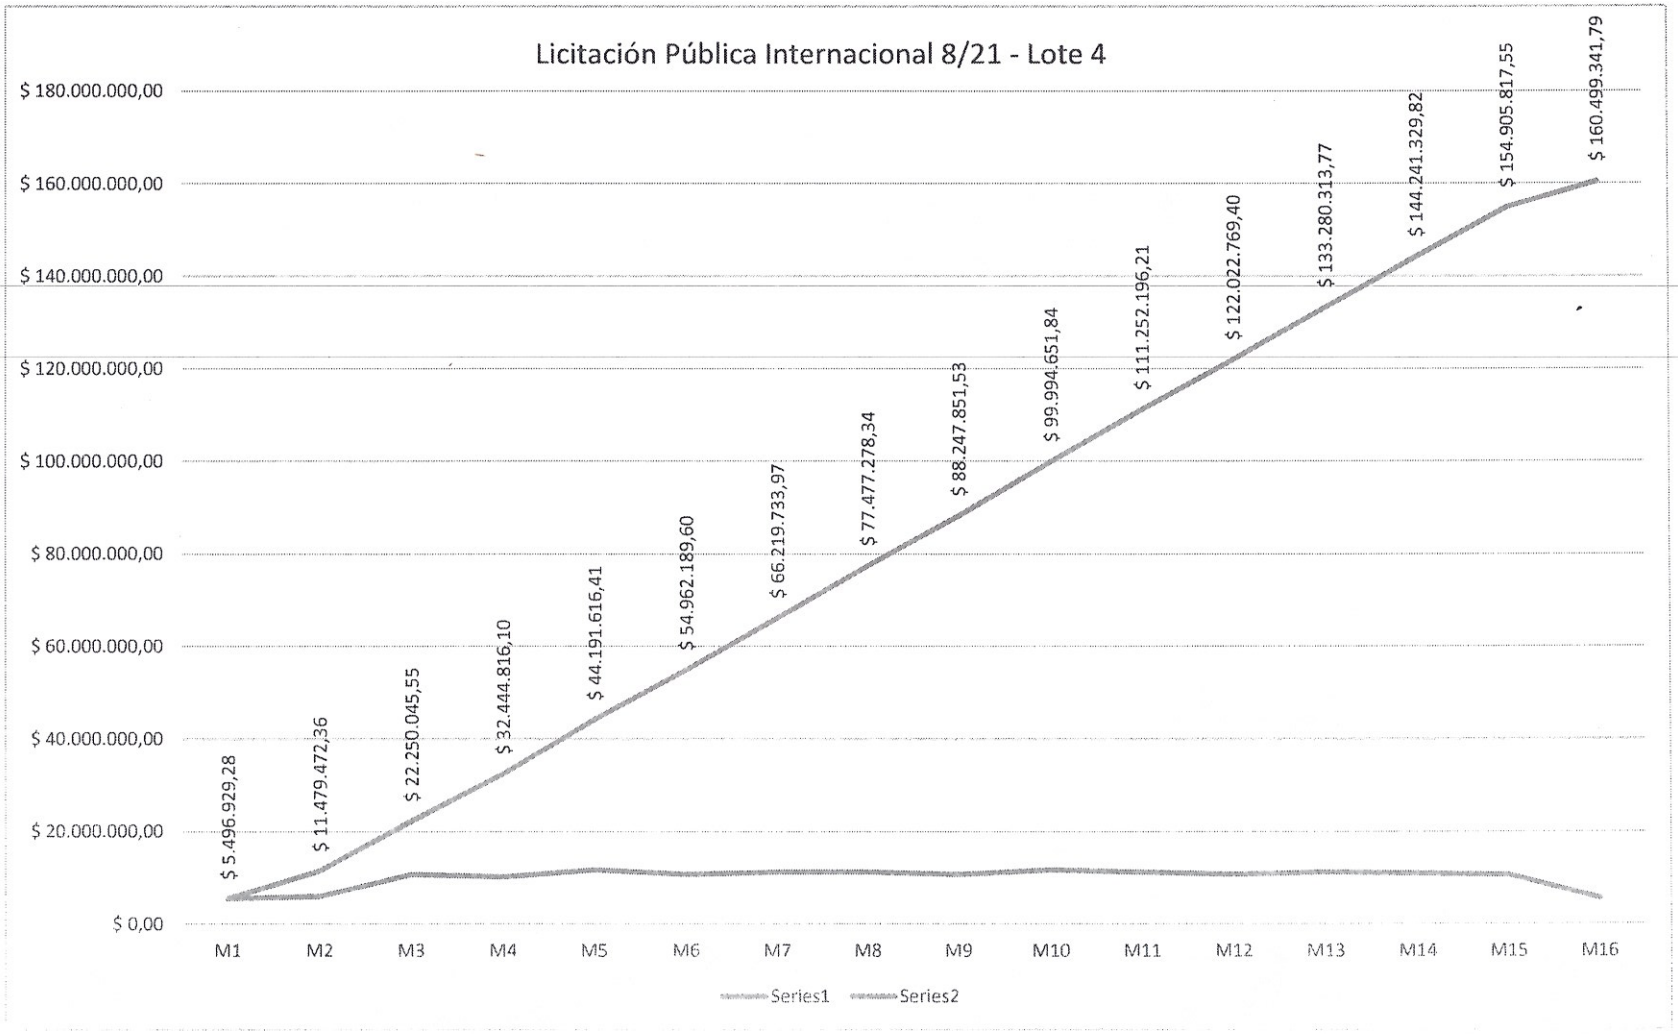

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 38561 - LEY 6140

ECOSUR BAHIA S.A.
Lic. DIEGO PABLO MOGUILANSKY
PRESIDENTE

FOLIO Nº 116

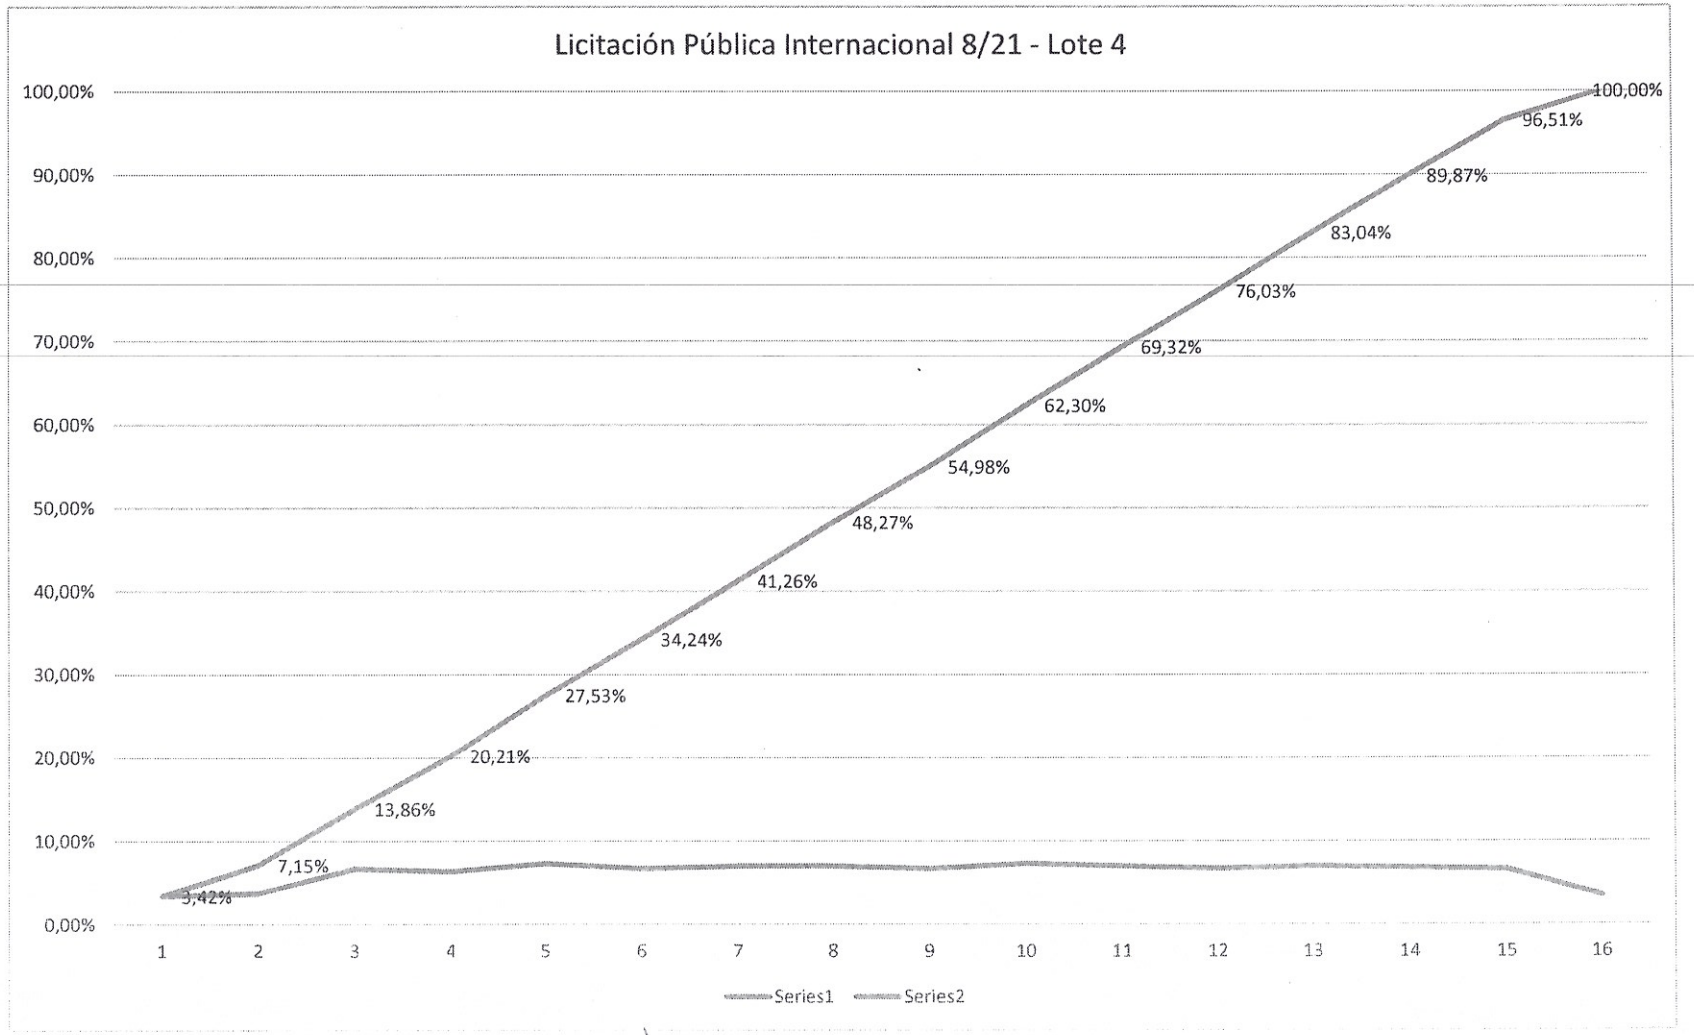


IF-2024-08929893-GDEBA-DPAYCMIYSPGP

FOLIO Nº 117

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 36491 - LEY 5140

ECOSUR BAHIA S.A.
Lic. DIEGO PABLO MOGUILIANSKY
PRESIDENTE

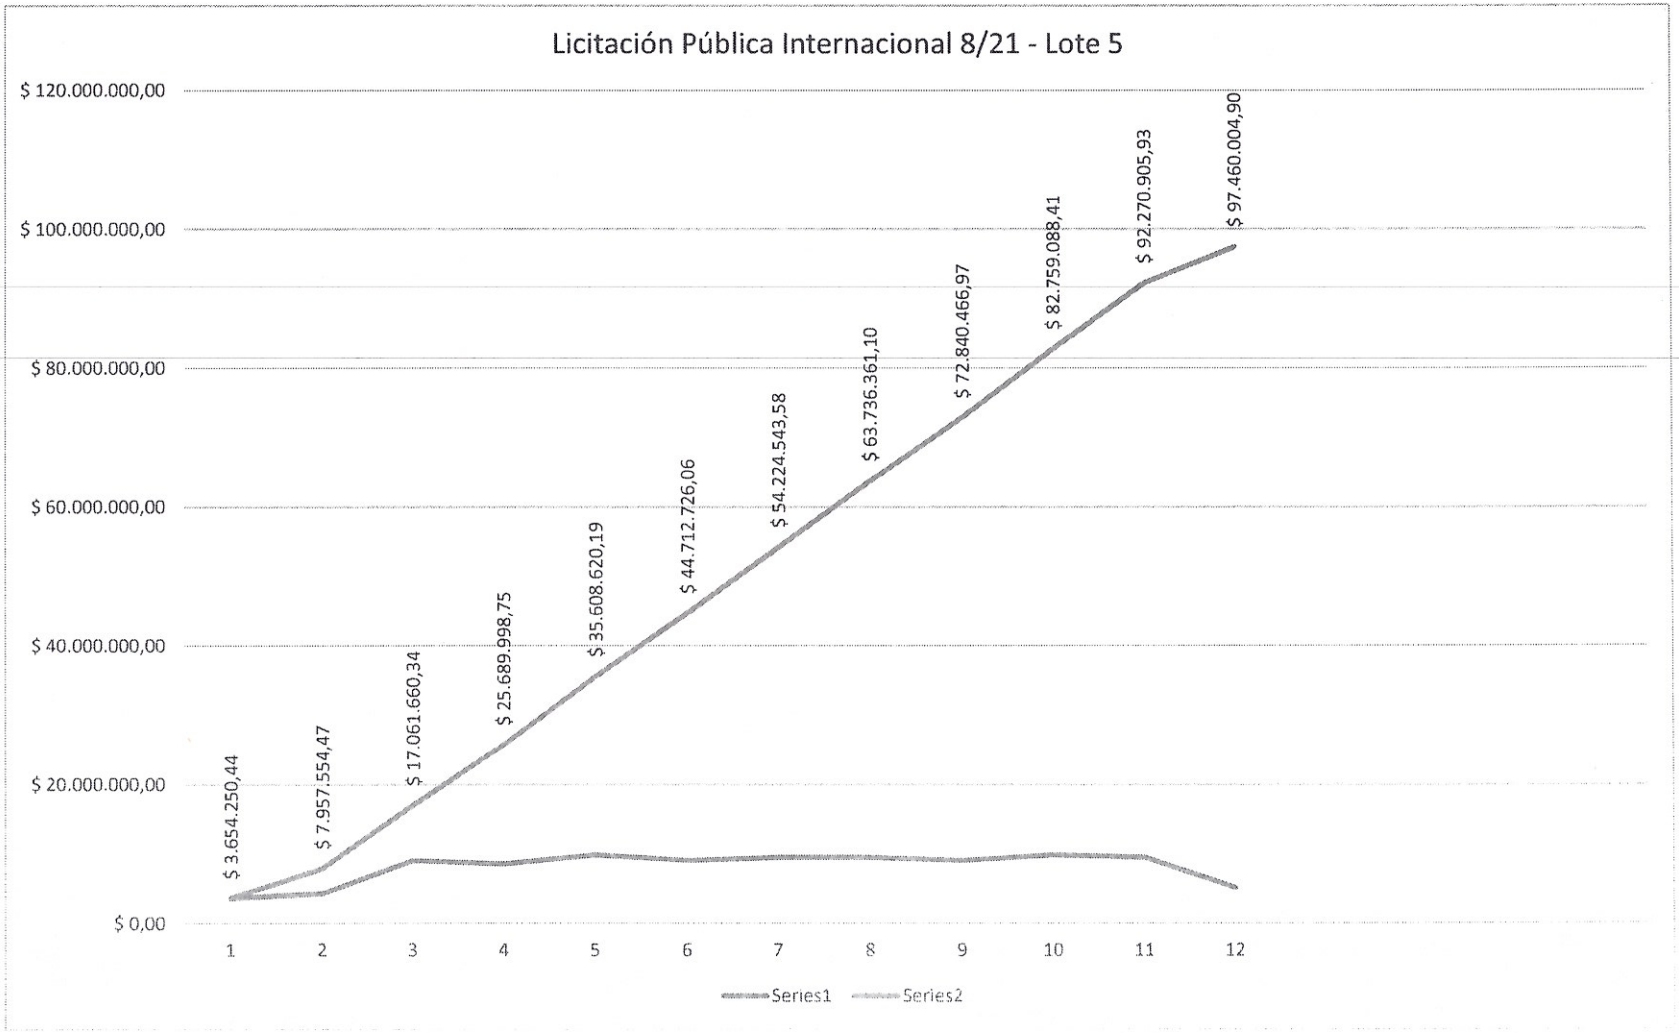


IF-2024-08929893-GDEBA-DPAYCMIYSPGP

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 3666 - LEY 5140

ECOSUR BAHIA S.A.
Lic. DIEGO PABLO MOGUILIANSKY
PRESIDENTE

Nº 116

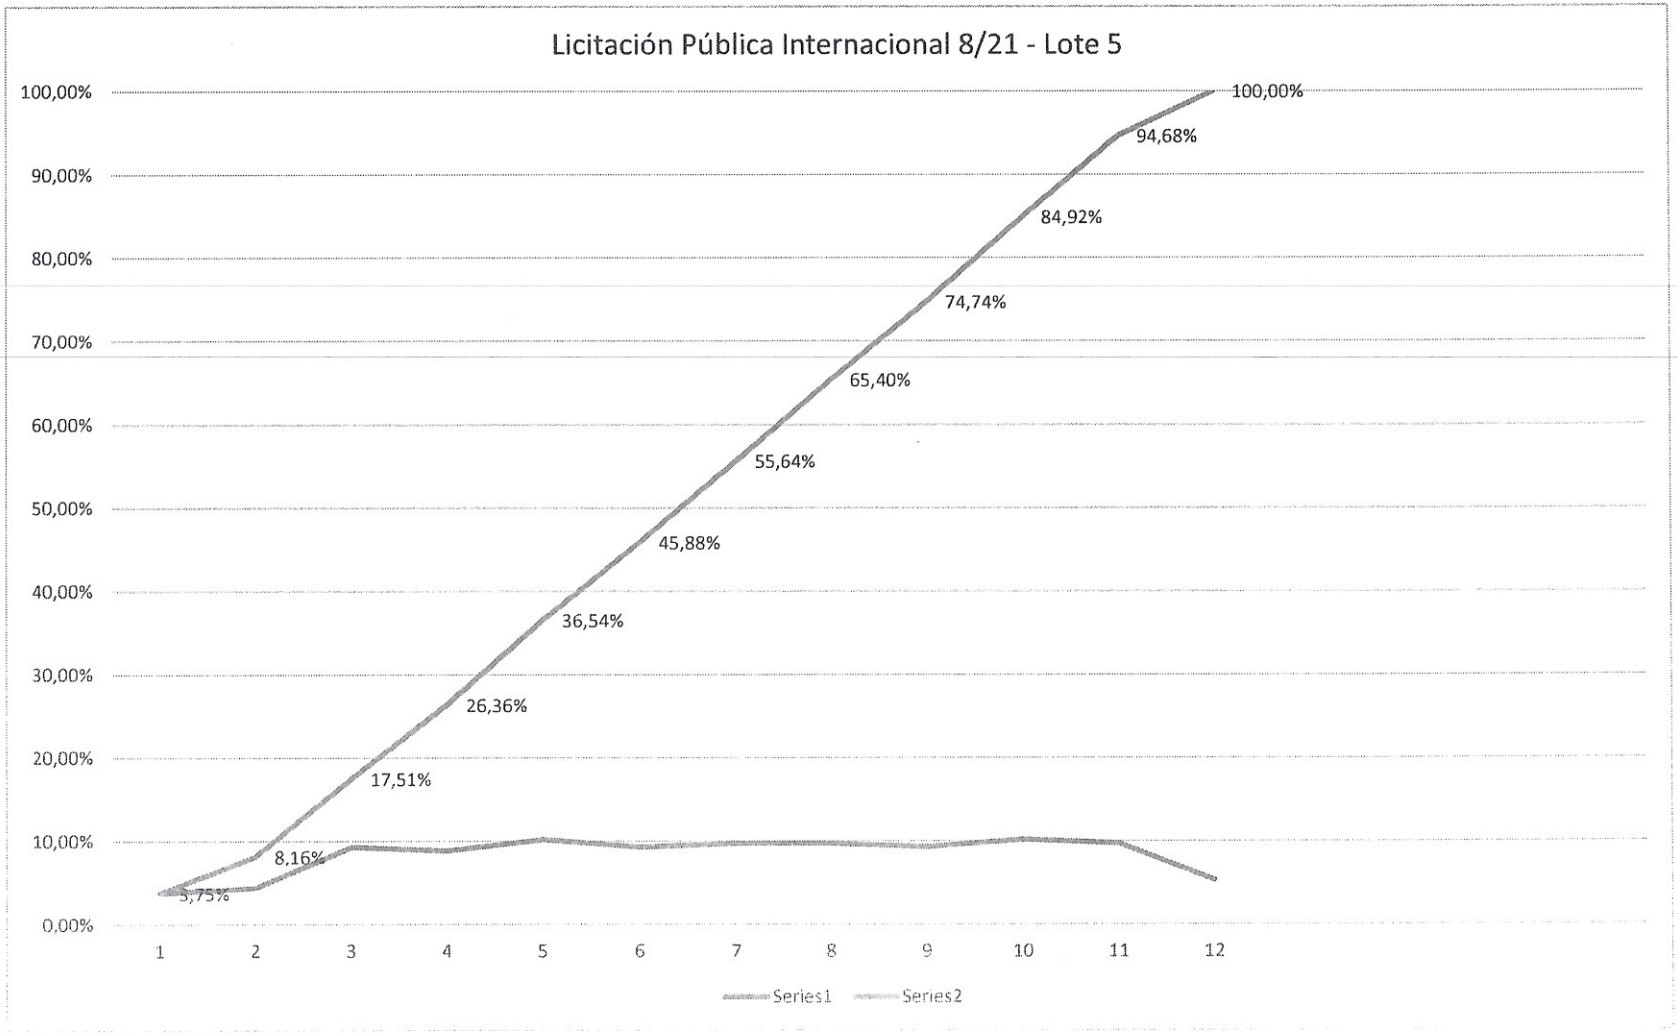

NESTOR JULIO TEPLITZ
INGENIERO CIVIL
MAT. 36587 - LEY 6140

ECOSUR BAHIA S.A.
Lic. DIEGO PABLO MOGUILIANSKY
PRESIDENTE

111

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 75° Aniversario de la gratuidad universitaria en la República Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2024-08929893-GDEBA-DPAYCMIYSPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 15 de Marzo de 2024

Referencia: Plan de trabajos y curvas de inversion Bahia Blanca Mod 6 a 10

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 32 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS, ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511
Date: 2024.03.15 09:47:27 -03'00'

SEBASTIAN LEANDRO SANCHEZ
Personal Profesional
Dirección Provincial de Agua y Cloacas
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS, ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511
Date: 2024.03.15 09:47:29 -03'00'
