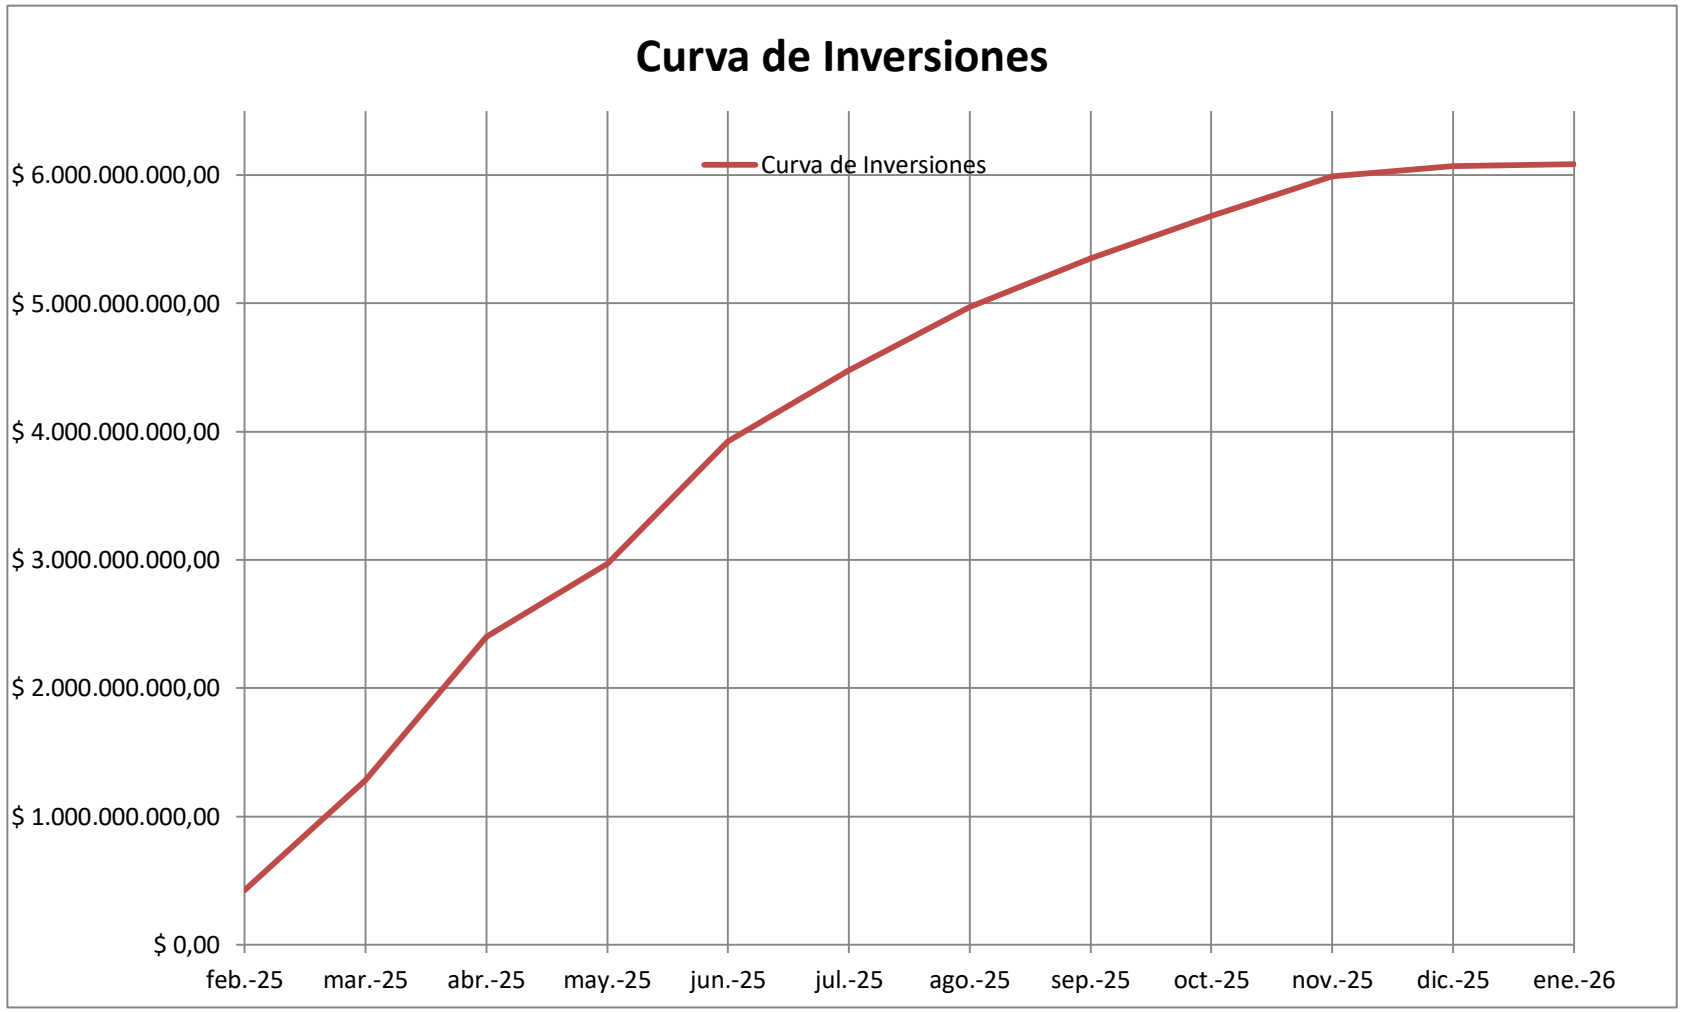
Nº	ITEM	U. M.	PLAZO DE OBRA											
			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
			febrero-25	marzo-25	abril-25	mayo-25	junio-25	julio-25	agosto-25	septiembre-25	octubre-25	noviembre-25	diciembre-25	enero-26
1.1.4	De pavimento y/o cuneta de hormigón, incluyendo la base.	m2	27,67%	1,35%	20,25%	10,96%	19,63%	2,82%	6,97%	1,22%	6,84%	2,29%	0,00%	0,00%
			6.780,19	330,70	4.961,33	2.684,57	4.811,10	691,47	1.707,73	299,01	1.676,09	561,36	0,00	0,00
1.2.1	Excavación de todo tipo no clasificada, incluido compactación, perfilado de	m3	29,21%	1,23%	21,34%	10,26%	19,68%	2,69%	2,73%	0,26%	4,78%	5,71%	2,09%	0,00%
			3.146,28	132,28	2.298,24	1.105,56	2.120,18	289,70	293,80	28,31	515,30	615,45	225,50	0,00
1.2.4	Saneamiento con provisión de suelos seleccionado	m3	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Saneamiento con provisión de suelos seleccionado y/o R.A.P. con	m3	4,69%	16,13%	18,80%	17,58%	25,25%	6,46%	0,00%	0,00%	0,00%	9,01%	2,08%	0,00%
			151,38	520,17	606,14	566,94	814,13	208,23	0,00	0,00	0,00	290,44	66,95	0,00
1.3.3	De hormigón H8 de espesor 0,15m a 0,18m, para superficies menores a	m2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,03%	6,82%	28,86%	12,64%	34,11%	13,53%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	208,64	352,93	1.492,31	653,76	1.764,07	699,91	0,00	0,00
1.3.4	De hormigón H8 de espesor 0,15m a 0,18m, para superficies mayores a	m2	11,21%	23,85%	23,21%	13,14%	23,05%	1,86%	1,19%	0,00%	0,00%	1,13%	0,00%	1,37%
			2.394,97	5.095,52	4.958,82	2.807,31	4.925,74	397,10	255,00	0,00	0,00	240,58	0,00	292,00
1.3.8	Membrana de polietileno de 200 micrones	m2	7,01%	21,22%	19,78%	7,44%	16,53%	12,00%	5,15%	0,30%	6,65%	3,57%	0,00%	0,35%
			1.859,67	5.630,82	5.249,06	1.974,86	4.386,33	3.184,45	1.367,15	80,88	1.764,07	947,50	0,00	92,51
3.4	Pavimento de Hormigón H30 de entre 0,25m hasta 0,27m de espesor	m2	7,09%	21,73%	19,94%	7,66%	14,11%	12,07%	5,12%	1,46%	6,74%	3,75%	0,33%	0,00%
			1.763,41	5.406,48	4.961,33	1.904,64	3.510,23	3.002,19	1.273,42	363,01	1.676,09	932,86	82,89	0,00
4.1.1	Ejecución de contrapiso liviano de hormigón h8 de espesor entre 8 y 12 cm,	m2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,70%	4,52%	2,65%	48,73%	4,25%	2,12%	34,03%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	61,32	75,00	44,00	808,00	70,40	35,20	564,18	0,00
4.1.2	Provisión y colocación de solados de baldosa de hormigón de señalización (alerta amarilla, 121 panes peltre, otros)	m2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,51%	9,19%	5,39%	41,89%	8,63%	4,31%	23,07%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	61,32	75,00	44,00	341,80	70,40	35,20	188,28	0,00
4.1.3	Provisión y colocación de solados de baldosa calcárea 40x40cm. Incluye la	m2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,66%	45,19%	42,14%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31	190,29	177,45	0,00
4.1.4	Provisión y colocación de solados de baldosón de cemento 60x40cm. Incluye	m2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,66%	45,19%	42,14%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31	190,29	177,45	0,00
4.2.2	Construcción y/o reconstrucción de veredas de hormigón armado texturado del tipo peinado o similar. Incluye remoción, retiro del	m2	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,35%	30,48%	15,78%	0,96%	6,84%	4,96%	0,13%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	919,33	958,42	1.400,85	725,19	43,99	314,33	227,81	5,78	0,00
4.3.1	Provisión y colocación de vados de hormigón comprendiendo la demolición de la vereda, contrapiso y cordón de pavimento existente,	m2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,41%	20,27%	25,32%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,60	204,00	254,80
5.1.1	Excavaciones hasta una profundidad <= a 2,50m de manera manual y/o	m3	0,00%	7,58%	8,82%	2,84%	5,21%	3,79%	8,25%	1,42%	18,98%	37,71%	5,40%	0,00%
			0,00	38,40	44,64	14,40	26,40	19,20	41,76	7,20	96,12	190,94	27,34	0,00
5.1.2	Excavaciones de profundidad entre 2,60 m y 4 m. de manera manual y/o	m3	0,00%	0,00%	68,64%	0,00%	26,63%	0,00%	4,63%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	630,00	0,00	244,40	0,00	42,50	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1	Provisión e instalación de cañerías de hormigón armado, incluyendo perfilado del fondo, hormigón de limpieza, lecho de arena,	ml	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,71%	34,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5	Idem para cañería Ø 600 mm	ml	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,13%	49,39%	31,48%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	113,60	72,40	0,00
5.3.6	Idem para cañería Ø 500 mm	ml	0,00%	20,00%	17,50%	7,50%	15,00%	10,00%	18,75%	0,83%	3,13%	0,00%	7,29%	0,00%
			0,00	38,40	33,60	14,40	28,80	19,20	36,00	1,60	6,00	0,00	14,00	0,00
5.3.8	Idem para cañería Ø1200 mm	ml	0,00%	0,00%	66,32%	0,00%	24,74%	0,00%	8,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	126,00	0,00	47,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.6	Provisión de materiales y mano de obra para la construcción de sumidero	un	0,00%	0,00%	10,23%	2,27%	12,50%	23,86%	12,50%	37,50%	0,00%	1,14%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	9,00	2,00	11,00	21,00	11,00	33,00	0,00	1,00	0,00	0,00
5.7.9	Provisión de materiales y mano de obra para la construcción de cámara de empalme con tabiques y vigas de Hormigón Armado, muros	m2	0,00%	0,00%	32,11%	0,00%	11,90%	5,29%	35,28%	15,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	121,40	0,00	45,00	20,00	133,38	58,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	Pintura termo plástica de 3 mm de espesor todo incluido, color blanco/	m2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,14%	50,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,32	451,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.10	Pintura termoplástica de 1,5 mm de espesor todo incluido, color blanco/	m2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1	Colocacion de Postes-Tubo estructural 3,00 mts de aleta simple o doble con	un	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,55%	0,00%	6,45%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	4,00	0,00	0,00
6.3.4	Chapa circular grado ingeniería diam hasta 60cm	un	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,55%	0,00%	6,45%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	4,00	0,00	0,00
7.1.4	Cordón integral de hormigón	ml	0,00%	0,00%	64,65%	3,76%	1,37%	6,56%	3,80%	0,44%	0,00%	19,41%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	2.115,50	123,10	44,80	214,80	124,50	14,40	0,00	635,18	0,00	0,00
7.1.9	Reconstrucción de cordón de hormigón armado recto, curvo o rebajado,	ml	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,27%	14,61%	14,39%	21,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	269,06	79,80	78,60	118,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.10	Recalce y nivelacion de De tapas de fundición de tamaño mayor a 60x60cm (o dia metro 60cm) No incluye Provision.	un	0,00%	0,00%	68,75%	0,00%	31,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	11,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.1	Sellado de juntas, fisuras y/o grietas en pavimentas asfálticos y/o de hormigón	ml	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.9	Provisión y colocación de caño reforzado de PVC (clase VI), diametro	ml	0,00%	0,00%	0,00%	31,09%	19,22%	6,26%	3,26%	28,47%	0,00%	11,70%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	228,90	141,50	46,10	24,00	209,66	0,00	86,14	0,00	0,00
7.7.14	Reacondicionamiento de columna de alumbrado (pintura)	un	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Platea de Hº para módulo de refugio tipo C	m3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Refugio tipo C según detalle	un	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CERTIFICACION PARCIAL s/IMPUESTOS		$ 423.049.569,73	$ 861.514.924,23	$ 1.116.473.257,20	$ 571.123.054,08	$ 951.138.531,13	$ 553.957.331,03	$ 492.718.616,17	$ 383.900.247,14	$ 328.692.237,74	$ 308.611.654,26	$ 77.636.448,92	$ 18.176.049,51
	CERTIFICACION ACUMULADA s/IMPUESTOS		$ 423.049.569,73	$ 1.284.564.493,95	$ 2.401.037.751,15	$ 2.972.160.805,23	$ 3.923.299.336,36	$ 4.477.256.667,39	$ 4.969.975.283,56	$ 5.353.875.530,71	$ 5.682.567.768,44	$ 5.991.179.422,70	$ 6.068.815.871,62	$ 6.086.991.921,12
	CERTIFICACION PARCIAL		6,95%	14,15%	18,34%	9,38%	15,63%	9,10%	8,09%	6,31%	5,40%	5,07%	1,28%	0,30%
	CERTIFICACION ACUMULADA		6,95%	21,10%	39,45%	48,83%	64,45%	73,55%	81,65%	87,96%	93,36%	98,43%	99,70%	100,00%

CARLOS A. DELLAGIOVANNA
ING. CIVIL
Mat. Nac. 14333 - Pcia. Bs. As. 42236
REPRESENTANTE TECNICO

CONSTRUIMEX S.A.
CARLOS JAVIER TRAPANI
APODERADO


Curva de Inversiones
Curva de Inversiones
$ 6.000.000.000,00
$ 5.000.000.000,00
$ 4.000.000.000,00
$ 3.000.000.000,00
$ 2.000.000.000,00
$ 1.000.000.000,00
$ 0,00
feb.-25
mar.-25
abr.-25
may.-25
jun.-25
jul.-25
ago.-25
sep.-25
oct.-25
nov.-25
dic.-25
ene.-26

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2026 - "Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última Dictadura cívico militar"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2026-17594160-GDEBA-DPAMIYSPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 21 de Mayo de 2026

Referencia: EX-2025-44310372- -GDEBA-DPTLMIYSPGP - Plan de Trabajo y Curva de Inversión - Obra: “Intervenciones de Corredores Urbanos en el Área Metropolitana de Buenos Aires – Movilidad y Accesibilidad Sostenible (MAS) PBA – Etapa I”

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2026.05.21 09:03:08 -03'00'

Melina Almada
Personal Administrativo
Dirección Provincial de Arquitectura
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2026.05.21 09:03:09 -03'00'
